



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“

ДО АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ „ДУНАВ“

(наименование на Възложителя)

ОТ: ОБЕДИНЕНИЕ „АДО КОМЮНИКЕЙШЪН“

(наименование на участника)

ЕИК: НЕПРИЛОЖИМО (* когато е приложимо)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Срокът за изпълнение на поръчката е 3 /три/ месеца от получаването на Възлагателното писмо, като в тези три месеца - срокът за създаване на приложение за смартфон/друго преносимо устройство е до 60 /шестдесет/ работни дни.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

(ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според обявените условия/изискванията, посочени в техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка)

(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)



Съдържание

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА	9
I.1. Въведение	9
I.2. Методология за изпълнение на дейностите	13
Дейност 1.	13
1.1. Предложение за изпълнение на дейност 1.	13
1.1.1. Под-дейност 1.1.	13
1.1.2. Под-дейност 1.2.	14
1.1.3. Под-дейност 1.3.	16
1.1.4. Под-дейност 1.4.	17
1.1.5. Под-дейност 1.5.	17
1.1.6. Под-дейност 1.6.	18
1.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им.	18
1.2.1. Взаимовръзка 1.	18
1.2.2. Взаимовръзка 2.	18
1.2.3. Взаимовръзка 3.	19
1.2.4. Взаимовръзка 4.	19
1.2.5. Взаимовръзка 5.	19
1.2.6. Взаимовръзка 6.	19
Дейност 2.	20
2.1. Предложение за изпълнение на дейност 2.	20
2.1.1. Под-дейност 2.1.	20
2.1.2. Под-дейност 2.2.	22
2.1.3. Под-дейност 2.3.	23
2.1.4. Под-дейност 2.4.	24
2.1.5. Под-дейност 2.5.	27
2.1.6. Под-дейност 2.6.	31
2.1.7. Под-дейност 2.7.	32
2.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им.	33
2.2.1. Взаимовръзка 7.	33
2.2.2. Взаимовръзка 8.	33



2.2.3. Взаимовръзка 9.	33
2.2.4. Взаимовръзка 10.	34
Дейност 3.	34
3.1. Предложение за изпълнение на дейност 3.	34
3.1.1. Под-дейност 3.1.	34
3.1.2. Под-дейност 3.2.	35
3.1.3. Под-дейност 3.3.	36
3.1.4. Под-дейност 3.4.	36
3.1.5. Под-дейност 3.5.	37
3.1.6. Под-дейност 3.6.	37
3.1.7. Под-дейност 3.7.	38
3.1.8. Под-дейност 3.8.	38
3.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	39
3.2.1. Взаимовръзка 11.	39
3.2.2. Взаимовръзка 12.	39
3.2.3. Взаимовръзка 13.	39
3.2.4. Взаимовръзка 14.	40
3.2.5. Взаимовръзка 15.	40
Дейност 4.	40
4.1. Предложение за изпълнение на дейност 4.	40
4.1.1. Под-дейност 4.1.	40
4.1.2. Под-дейност 4.2.	41
4.1.3. Под-дейност 4.3.	41
4.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	42
4.2.1. Взаимовръзка 16.	42
4.2.2. Взаимовръзка 17.	42
4.2.3. Взаимовръзка 18.	42
Дейност 5.	42
5.1. Предложение за изпълнение на дейност 5.	43
5.1.1. Под-дейност 5.1.	43
5.1.2. Под-дейност 5.2.	44
5.1.3. Под-дейност 5.3.	44
5.1.4. Под-дейност 5.4.	45



5.1.5.Под-дейност 5.5.	45
5.1.6.Под-дейност 5.6.	46
5.1.7.Под-дейност 5.7.	46
5.1.8.Под-дейност 5.8.	47
5.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	47
им.	47
5.2.1.Взаимовръзка 19.	47
5.2.2.Взаимовръзка 20.	48
5.2.3.Взаимовръзка 21.	48
5.2.4.Взаимовръзка 22.	48
5.2.5.Взаимовръзка 23.	49
Дейност 6.	49
6.1.Предложение за изпълнение на дейност 2.	49
6.1.1.Под-дейност 6.1.	49
6.1.2.Под-дейност 6.2.	50
6.1.3.Под-дейност 6.3.	51
6.1.4.Под-дейност 6.4.	52
6.1.5.Под-дейност 6.5.	53
6.1.6.Под-дейност 6.6.	53
6.1.7.Под-дейност 6.7.	54
6.1.8.Под-дейност 6.8.	54
6.1.9.Под-дейност 6.9.	55
6.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	56
им.	56
6.2.1.Взаимовръзка 24.	56
6.2.2.Взаимовръзка 25.	56
6.2.3.Взаимовръзка 26.	56
6.2.4.Взаимовръзка 27.	56
6.2.5.Взаимовръзка 28.	57
6.2.6.Взаимовръзка 29.	57
6.2.7.Взаимовръзка 30.	57
6.2.8.Взаимовръзка 31.	57
Дейност 7.	58
7.1.Предложение за изпълнение на дейност 7.	58
7.1.1.Под-дейност 7.1.	58
7.1.2.Под-дейност 7.2.	59
7.1.3.Под-дейност 7.3.	59



7.1.4.Под-дейност 7.4.	60
7.1.5.Под-дейност 7.5.	60
7.1.6.Под-дейност 7.6.	61
7.1.7.Под-дейност 7.7.	61
7.1.8.Под-дейност 7.8.	62
7.1.9.Под-дейност 7.9.	62
7.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им.	62
7.2.1.Взаимовръзка 32.	62
7.2.2.Взаимовръзка 33.	63
7.2.3.Взаимовръзка 34.	63
7.2.4.Взаимовръзка 35.	63
7.2.5.Взаимовръзка 36.	63
7.2.6.Взаимовръзка 37.	64
Дейност 8.	64
8.1.Предложение за изпълнение на дейност 8.	64
8.1.1.Под-дейност 8.1.	64
8.1.2.Под-дейност 8.2.	65
8.1.3.Под-дейност 8.3.	65
8.1.4.Под-дейност 8.4.	66
8.1.5.Под-дейност 8.5.	66
8.1.6.Под-дейност 8.6.	67
8.1.7.Под-дейност 8.7.	67
8.1.8.Под-дейност 8.8.	67
8.1.9.Под-дейност 8.9.	68
8.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им.	68
8.2.1.Взаимовръзка 38.	68
8.2.2.Взаимовръзка 39.	68
8.2.3.Взаимовръзка 40.	69
8.2.4.Взаимовръзка 41.	69



8.2.5.Взаимовръзка 42.	69
8.2.6.Взаимовръзка 43.	69
Дейност 9.	
9.1.Предложение за изпълнение на дейност 9.	70
9.1.1.Под-дейност 9.1.	70
9.1.2.Под-дейност 9.2.	70
9.1.3.Под-дейност 9.3.	71
9.1.4.Под-дейност 9.4.	71
9.1.5.Под-дейност 9.5.	71
9.1.6.Под-дейност 9.6.	72
9.1.7.Под-дейност 9.7.	73
9.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	
им.	74
9.2.1.Взаимовръзка 44.	74
9.2.2.Взаимовръзка 45.	74
Дейност 10.	
10.1.Предложение за изпълнение на дейност 10.	75
10.1.1.Под-дейност 10.1.	75
10.1.2.Под-дейност 10.2.	75
10.1.3.Под-дейност 10.3.	75
10.1.4.Под-дейност 10.4.	76
10.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	
им.	76
10.2.1.Взаимовръзка 46.	76
Дейност 11.	
11.1.Предложение за изпълнение на дейност 11.	77
11.1.1.Под-дейност 11.1.	77
11.1.2.Под-дейност 11.2.	77
11.1.3.Под-дейност 11.3.	78
11.1.4.Под-дейност 11.4.	78
11.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	
им.	79
11.2.1.Взаимовръзка 47.	79



Дейност 12. [REDACTED]	79
12.1. Предложение за изпълнение на дейност 12.	79
12.1.1. Под-дейност 12.1. [REDACTED]	79
12.1.2. Под-дейност 12.2. [REDACTED]	79
12.1.3. Под-дейност 12.3. [REDACTED]	80
12.1.4. Под-дейност 12.4. [REDACTED]	81
12.1.5. Под-дейност 12.5. [REDACTED]	81
12.1.6. Под-дейност 12.6. [REDACTED]	82
12.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	83
им.	83
12.2.1. Взаимовръзка 48.	83
Дейност 13. [REDACTED]	83
13.1. Предложение за изпълнение на дейност 13.	83
13.1.1. Под-дейност 13.1. [REDACTED]	83
13.1.2. Под-дейност 13.2. [REDACTED]	84
13.1.3. Под-дейност 13.3. [REDACTED]	84
13.1.4. Под-дейност 13.4. [REDACTED]	85
13.1.5. Под-дейност 13.5. [REDACTED]	85
13.1.6. Под-дейност 13.6. [REDACTED]	85
13.1.7. Под-дейност 11.7. [REDACTED]	86
13.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението	86
им.	86
13.2.1. Взаимовръзка 49.	86
13.2.2. Взаимовръзка 50.	87
13.2.3. Взаимовръзка 51.	87
II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА	87
II.1. Организация за изпълнение на отделните дейности/под-дейности	87
II.2. Предложение за действията и функциите на експертите	88
2.1. Действия и функции на ключовите експерти	88
2.2. Действия и функции на допълнителните експерти	95
II.3. Описание на начините на разпределение на дейностите и отговорностите	102
между всеки един от експертите	102
II.4. Връзка и съответствие между предвидената организация за изпълнение и	105
предложението за мобилизацията и разпределението на използваните човешки	105
ресурси	105
III. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО	117
III.1. Подход за управление на качеството	117
III.2. Мерки за осигуряване на качеството	117
Мярка 1. [REDACTED]	117
Мярка 2. [REDACTED]	120
	7



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ПУБЛИЧНО АДМИНИСТРАЦИЯ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA-BULGARIA



Interreg



Мярка 3.

123

Мярка 4.

124

Мярка 5.

124

Мярка 6.

135



I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.1. Въведение

Настоящата част от техническото предложение е разработена, съгласно изискванията на Възложителя в свободен формат и е съобразена с условията/изискванията, посочени в техническата спецификация и показателите, посочени в методиката за оценка. Всички предлагани от Консултанта действия, необходими за изпълнението на поръчката са описани под формата на дейности и под-дейности, които ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

В рамките на настоящата поръчка е предвидено разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез разработване и усъвършенстване на интегриран туристически продукт за културно наследство - Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Според информация, предоставена в документацията за поръчката, Раздел VI. Пълно описание на предмета на обществената поръчка, промоционалните материали са необходими за създаването на условия за реализация на потенциала за развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Румъния-България, както и за неговото устойчиво развитие. Туризмът, в частност културно-историческият, е ключов сектор в развитието на трансграничния регион, както е посочено в стратегически и програмни документи на различни нива на управление. Регионът е богат на културни локации и обекти; една от най-значимите съвместни културни ценности на целевия регион е споделеното римско наследство; има римски археологически обекти и богати музейни колекции. Аспекти на тази туристическа тема се разработват и са направени инфраструктурни инвестиции, в това число и с финансиране от Европейския съюз.

Промоционалните материали ще послужат за промоцирането на съвместен културно-исторически туристически продукт в трансграничния регион Румъния-България и ще осигури устойчивото използване на общото римско културно наследство.

Обхват на поръчката и очаквани резултати

1. Разработване на концепция и създаване на приложение за смартфон/друго преносимо устройство;
2. Разработване на уебсайт;
3. Създаване на 120-минутен информационен филм за туристическия продукт;
4. Изработване и отпечатване на информационен каталог;
5. Изработване и отпечатване на брошура;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



Handwritten signature

Подход на Участника за изпълнение на поръчката

Днес, когато културно-историческото наследство все по-често се възприема в нова, по-добра светлина, начините за популяризирането му се променят и включват нови елементи, които биха могли да помогнат на местните общности да получат по-очевидни ползи от културното си наследство, като същевременно запазват и поддържат своята уникалност. Често тези елементи са свързани с туризма: нов вид туризъм, който уважава околната среда, природното и културното наследство, както и местните традиции.

Популяризирането на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, разработен по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“, предполага прилагането на новаторски подход, промотиращ не само обектите, включени в маршрута, но и широкото прилагане на елементи на устойчив и отговорен туризъм, съчетани с допълнителни ползи за населението в трансграничния регион Румъния - България. Иновативността на нашият подход се крие в специалното внимание, което се обръща на уникалността на маршрута и на приложимостта на допълнителни активности и информация, които биха допринесли за създаването на добавена стойност и ползи в конкретните социално-културни, екологични, икономически и институционални условия.

В тази насока нашият подход подчертава възможностите, които популяризирането на маршрута предлага и за социално-икономическия напредък на местните общности в дестинациите, разположени по маршрута, чрез обединяването на основно и съпътстващо съдържание на промоционалните материали, подробно разписани в методологията по изпълнението на тази поръчка.

Целите, които си поставяме в обхвата на поръчката са изцяло в съответствие с и европейския дневен ред, където културните маршрути набират все по-значителен интерес както сред специалистите в областта на културата и туризма, така и сред политически отговорните лица на различни нива.

Нашият подход ще осигури не само синхрон с европейската тенденция за съживяване и насърчаване на интереса към общото европейско наследство, но и ще развие потенциала, който маршрутът представлява за икономическия и социален напредък на местните общности :

- чрез качествено промотиране на туристическия маршрут по проекта ще се създадат възможности за съживяване и насърчаване на интереса към общото европейско наследство, и в частност римското културно-историческо наследство в трансграничния регион Румъния - България
- ще се доразвие потенциалът, който маршрута представлява за икономическия и социален напредък на местните общности в региона

Handwritten signature

Handwritten signature

10



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



- икономическо развитие и генериране на заетост, например чрез подпомагане или създаване на нови туристически малки и средни предприятия;
- нарастване на културното разбиране между местното население в трансграничния регион Румъния - България и посетителите на културните пътища чрез оценяването и запазването на уникалността на местното наследство и традиции;
- увеличаване на общата привлекателност на общностите и дестинациите, край които минава маршрутът;
- запазване на местното население и подобряване на качеството на живот като цяло;
- повишаване на осведомеността за общото културно- историческо наследство и традиции чрез разпространението на промоционалните материали.

Обработката на темата изисква мултидисциплинарност и съчетаване на изработените в рамките на проекта проучвания и стратегии, научна и специализирана информация, но също така и емоционални, социални, морални и интелектуални преживявания, за да достигне по-лесно до крайния потребител, въздействайки му на всички нива.

Разработеният многоизмерен подход за промотиране на туристическия маршрут съчетава всички тези изисквания и ги използва за създаването на синергични и функционални продукти, оставящи трайна следа в ума на ползвателите им.





Общи цели на многоизмерния подход за промотиране на туристически маршрут:

- информационни - нови прозрения по темата, идеи, връзки, контекст, стил;
- образователни и промоционални - създаване на положителни нагласи, гледни точки, мнения, ангажимент, които ние искаме да предадем на потребителя;
- функционални - умения и компетенции, които са разработени в процеса на прилагане на тълкуването - чрез взаимодействие в хода на маршрута, новоткрит интерес към новия туристически продукт;
- вдъхновяващи - даване на възможност на туриста да изрази собствените си впечатления от темата, развитие на културна чувствителност и култура на комуникация и обмен.

Именно такъв многостранен подход дава възможност за създаването на продукти, ориентирани към крайния потребител, заедно с богат набор от необходимите елементи на образование, дейност, участие и отдих. Комбинирането на обектите по маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ и резултатите, постигнати по проект проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“, заедно с съпътстващата информация, осигуряват необходимото фокусиране върху крайните очаквания на посетителите и ангажиране на всичките им сетива. Като допълнителни ползи, крайните продукти също така ще допринесат за социалното благополучие и икономическо развитие на местните общности, защитата на техните екологични и природни ресурси, зачитането на социално - културната им автентичност и разнообразието на културното им наследство и традиции. Като гаранции за успеха на подхода, подробно разписаните мерки и дейности по изпълнението на поръчката предвиждат всички необходими предпоставки и механизми за постигане на:

- ангажираност на екипа и на Възложителя по отношение на ефективното изпълнение на проекта;
- активно сътрудничество между екипите;
- прилагане на адаптирана спрямо целите на проекта обща концепция за единна визия и кохерентна информация,
- използване на гъвкава методология и адекватни техники за изпълнение на предвидените дейности,
- активно информирание и координация между всички заинтересовани страни, навременно стартиране на дейностите по проекта
- идентичност и разпознаваемост, асоцииране на промоционалните продукти с проекта
- качество на вложените материали, съответствие на технологиите със съответния носител.



Handwritten signature

1.2. Методология за изпълнение на дейностите

Дейност 1.

1.1. Предложение за изпълнение на дейност 1.

За изработването на всички продукти ще приложим интегрирана концепция за единна визия и кохерентно информационно съдържание на отделните промоционални материали. В концепцията ще се заложи на използването на общи елементи за създаване на унифициран бранд и синхронно информационно съдържание, адаптирани спрямо спецификата на различните промоционални носители.

С използването на интегрирана концепция изработените материали ще се отличават с:

-
-
-
-
-
-
-

Предложените резултати от тази дейност не съставляват част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияят положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Интегрираният подход ще осигури едновременно последователност и индивидуален стил според технологичните възможности на всеки един от промоционалните материали, консистентност на информацията, адаптирана спрямо всеки промоционален материал, за постигане на ефекта на надграждане и провокиране на интереса на целевите групи, като ще гарантира разпознаваемост на всички продукти под един общ бранд. Дейността се състои от под-дейности, описани по-долу.

1.1.1. Под-дейност 1.1

Действия по изпълнението на под-дейност 1.1

Първата стъпка за изпълнение на поръчката е запознаване с наличните **[REDACTED]**, които са разработени по други дейности от проекта от други изпълнители. При запознаване с наличната **[REDACTED]** ще бъде приложен **[REDACTED]** за проучване, в чиято основа стои механизмът на вникване в съдържанието и смисъла на текста. Целта на тази дейност е да се получи обща информация за разработване на концепциите, изисквани от Възложителя. При необходимост



ще бъдат организирани работни срещи с екипите, изготвили предварителните проучвания и стратегиите (за развитие и маркетингова) по другите дейности от проекта.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 1.1.

Общият преглед на наличната [REDACTED] е важен етап за уточняване на базовата информация за изработване на промоционалните материали. При създаването на [REDACTED] е важно да се гарантира, че [REDACTED] се разбира добре от екипа, натоварен със селекцията на съдържанието и изработването на концепциите. С извършването на прегледа ще бъде определена [REDACTED]

Изпълнението на тази дейност ще бъде съобразено с изискването на Възложителя, посочено в Техническата спецификация, че като [REDACTED] за работата на избрания изпълнител в рамките на тази поръчка следва да бъдат използвани постигнатите резултати от изпълнителите на други дейности.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 1.1.

- Пълно и качествено разбиране на целия обем [REDACTED] и идентифициране на евентуални липси/несъответствия и неясноти

1.1.2. Под-дейност 1.2 [REDACTED]

Под-дейност 1.2 [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 1.2. (надграждаща)

При установени липси в предоставения от Възложителя обем [REDACTED], ще се предприемат стъпки за набавянето на информация по констатираните пропуски. Предвид факта, че маршрутът ще обедини културно и природно наследство, както и социалното и икономическо обкръжение, допълнителна информация по тази тема ще даде възможност на посетителите да се срещнат с хората, да опознаят културата, фолклора, етнологията и географското разнообразие по р. Дунав - не само на теория, но и на живо чрез опит и лични впечатления.

В приложената по-долу таблица са дадени примери за източници на допълнително съдържание, които могат да бъдат използвани при нужда, както и очакваните резултати.

Таблица 1. Примерни източници на [REDACTED]

Допълнителни източници	Какво може да се очаква от тях?
[REDACTED]	Високо качество на научна информация по дадена тема; коректни данни за атракциите; тълкуване и презентиране на интересни артефакти, находки, обекти
[REDACTED]	Високо качество на информация по дадена тема; информация за предстоящи събития от интерес за



[REDACTED]	туристите; Тълкуване и презентация на интересни артефакти, находки, обекти
[REDACTED]	Съпътстваща информация и добавена стойност на маршрута, тематично подходящи за различни сегменти посетители
[REDACTED]	Съпътстваща информация за оферти по маршрута, тематично подходящи за различни сегменти
[REDACTED]	Съпътстваща информация за пакети, организирани за целевите групи (ученици, студенти, специфични групи: тийм билдинг, чужди пазари, любители на историята, хора на изкуството).
[REDACTED]	Съпътстваща информация за промотирани обекти в рамките на маршрута и състояние на обектите, включени в маршрута. Подкрепя на промоционалните дейности, разпространение на продуктите
[REDACTED]	Съпътстваща информация за дейности и събития, както и свързаното структурно съдържание
[REDACTED]	Допълнително съдържание и разяснения за целеви образователни групи, социални групи и др. Материали на популярен език по сфери на интереси.
[REDACTED]	Културни календари, ежегодни събития, информация за предстоящи събития от интерес за туристите

При необходимост и по преценка на Възложителя може да бъде ползвана и информация, разработена в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“, както и на други проекти, реализирани в предходния програмен период, свързани с развитието на туризма в трансграничния регион Румъния - България.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 1.2

Осигуряването на допълнителни източници на надеждна [REDACTED] минимизира риска от генериране на материали с недостатъчно/ фрагментарно



или невярно съдържание. Целта е изработените материали да бъдат въздействащи и полезни от гледна точка на представянето на ориентирания към потребителите съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Качественото изпълнение на дейностите по изработването на промоционалните материали предполага създаването на ориентирани към потребителя продукти, заедно с богат набор от необходимите елементи на образование, дейност, участие и отдых. Комбинирането на дестинации и събития, които тематично попадат в сферата на интерес, заедно с маршрута, предполага фокусиране върху настроението на посетителите и ангажиране на всички сетива.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 1.2

- Създадена пълна [REDACTED], необходима за разработване на промоционалните материали.

1.1.3.Под-дейност 1.3. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 1.3. (надграждаща)

След извършване на общия преглед (вкл. запознаване) с наличните документи и информация, предоставена от Възложителя, и допълнително събраната такава, ще се извърши селектиране на полезната информация, която ще използва при изготвянето на концепции за тяхното изработване. Това са

[REDACTED]
създадени в рамките на проекта или допълнително осигурени по дейност 1.2.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 1.3.

След запознаване със съдържанието на наличните данни в събраната пълна информационна база и на база на целите, заложили в изготвените проучвания и стратегии по други дейности в рамките на проекта, ще имаме възможност да си отговорим на основните въпроси, необходими за качествената селекция на материали, подходящи за използване при изпълнение на дейностите в поръчката - каква е туристическата среда, коя е конкретната аудитория, какви са нейните демографски и културни особености, какви са техните интереси, мотивация и очаквания, как най-лесно да достигнем до тях и др.

Отговорите на тези въпроси ще насочат Консултанта към най-подходящото съдържание за промоционалните продукти, тъй като комуникирането на информацията за маршрута изисква систематичен подход към потребителите на материалите, респективно посетители на маршрута. Веднъж установени, тези данни ще бъдат използвани за да се систематизират и селектират точните теми/материали/информация, които да постигнат целите на проекта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 1.3.

- Селектирана полезна информация, необходима за разработване на промоционалните материали.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РОМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



1.1.4.Под-дейност 1.4. [REDACTED]

Действия по изпълнението на под-дейност 1.4. (надграждаща)

В тази под-дейност ще бъдат селектирани и обработени всички графични идентификатори, свързани с изпълнението на проекта според изискванията и в съответствие с графичните стандарти на приложимите правила за информация и публичност на Програма Interreg V-A Румъния България 2014-2020 г. Това ще даде основата, върху която ще бъдат разработени всички графични концепции по изработването на различните видове промоционални материали, съобразно техническите им спецификации.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 1.4.

Дизайнът на всички промоционалните материали следва да бъде съобразен с цветовата гама на графичните идентификатори на програмата, партньорите и проекта, така че да се постигне оригинална и стилистично издържана цветова композиция. Графичното решение и поддържащите елементи в дизайна ще подчертават единството в многообразието, като визуалните характеристики ще придадат идентичност и разпознаваемост на продуктите. Ще се гарантира спазването на шрифтове, размери, цветове и пространствено оформление съгласно изискванията на Наръчника за информация и публичност на Програма Interreg V-A Румъния България 2014-2020 г.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 1.4.

- Общи графични насоки при изработването на художествено-графичните проекти (дизайни) на всички промоционални материали.

1.1.5.Под-дейност 1.5. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 1.5. (надграждаща)

Консултантът предлага съвместно с Възложителя да се тества въздействието на разработените варианти на графична визия върху [REDACTED]. За целта ще бъде проведена [REDACTED], за да се оцени какви ще бъдат най-важните и въздействащи елементи на единната визуална концепция на всички промоционални материали и технологични решения за разработване на мобилните приложения и уеб сайта. В резултат на работата ще бъде избран варианта на визия на промоционалните материали или ще бъдат дадени конкретни препоръки за предприемане на корективни действия.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 1.5.

Работата в [REDACTED] осигурява активна обратна връзка, която е силно необходима в процеса на избор на визия на материалите. Провеждането на този етап от работата ще подпомогне недопускането на риск от разработване на материали, които няма да постигнат желания от Възложителя ефект.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 1.5.

Избран вариант за обща визия на промоционалните материали



1.1.6. Под-дейност 1.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 1.6. (надграждаща)

В рамките на тази под-дейност ще бъде създадена технологична спецификация и изработка на детайлна конструкция на продукта [REDACTED], по която ще се разработват графичния дизайн, функционалния и други, засегнати в следващите дейности. Ще бъдат направени основополагащи проучвания, заготовка на модели и методики, които ще бъдат спазвани или използвани при разработването на мобилните приложения и уеб сайта. На база събраната, проучена и систематизирана информация, ще се премине към цялостното описване и анализ на данните.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 1.6.

Спецификацията и конструкцията на продукта са в основата на един успешен проект, следвайки целеполагането и пазарната ниша. Чрез създадения ясен модел на работа, подготвен в детайли, се създава качествена основа за разработване на концепциите за приложение за смартфон/ друго преносимо устройство и включената в приложението интерактивна игра, както и за уебсайта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 1.6.

Създадена техническа спецификация и конструкция за мобилните приложения

1.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

1.2.1. Взаимовръзка 1.

Взаимовръзка 1. Връзка между доброто познаване на общата информация и идентифицирането на евентуални пропуски и селектирането на полезната информация за промоционалните материали

Качественото изпълнение на под-дейност 1.1 е в пряко взаимодействие с изпълнението на под-дейност 1.2, чрез която ще се запълнят идентифицираните липси в основната информация, след запознаване на Консултанта на представените от Възложителя материали, разработени от други изпълнители в обхвата на проекта и ще се гарантира успешното изпълнение на под-дейност 1.3. Под-дейност 1.2. е пряко следствие от под-дейност 1.1., която определя обхвата и обема на допълнителната информация.

1.2.2. Взаимовръзка 2.

Взаимовръзка 2: Връзка между селектираната информация по под-дейност 1.3 и изпълнението на дейност 2 [REDACTED]

След като предоставената информация бъде селектирана и организирана по полезност за целите на промоционалните материали ще се постигне яснота за ключови елементи от разработването на Концепциите: [REDACTED]



Качественото изпълнение на дейност 1.3 ще осигури последователност и консистентност на информацията, която ще залегне при изработването на концепции по дейност 2, както и при изпълнението на дейностите по изработването на самите промоционални материали.

1.2.3. Взаимовръзка 3.

Взаимовръзка 3: Връзка между предварителната спецификация и конструкция на мобилните приложения и уеб сайта и концепциите за приложение за смартфон/ друго преносимо устройство и включената в приложението интерактивна игра и уеб-сайта

Създаването на [REDACTED] (под-дейност 1.6.), която ляга изцяло на предоставената информация и селекцията и организацията на [REDACTED] (под-дейност 1.1. и 1.2.), ще постигне ясно изражение върху създаването на [REDACTED] (2.1., 2.2. и 2.3.), като дава яснота и визия на начина на предоставяне, селекция и подредба на информацията.

1.2.4. Взаимовръзка 4.

Взаимовръзка 4: Връзка между създадените графични насоки по дейност 1.4 при създаването на [REDACTED] по дейност 2 и дейностите по разработване на [REDACTED]

Изпълнението на дейност 1.4 ще залегне в разработването на всички [REDACTED] по дейност 2 и разработването на всички [REDACTED] на промоционалните продукти, като гарантира проектната идентичност и разпознаваемост на всички изработени материали, както и единната визия между отделните елементи.

1.2.5. Взаимовръзка 5.

Взаимовръзка 5: Връзка между общите графичните насоки и стриктното спазване на мерките за информация и публичност по Програмата

Чрез под-дейност 1.4 ще се постигне необходимият синхрон при изготвянето на [REDACTED] по Дейност 2 и [REDACTED], като се гарантира спазването на всички изисквания относно шрифтовете, размерите, цветовете и пространственото оформление съгласно и в съответствие с графичните стандарти на приложимите правила за информация и публичност на Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.

1.2.6. Взаимовръзка 6.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАЗНТЕЛСТВО



Interreg




Взаимовръзка 6: Връзка между качествено изпълнение на дейностите по изработка на промоционалните материали и общата концепция за единна визия и консистентност на информационното съдържание

Всички действия по изпълнението на Дейност 1. са в пряка връзка с качествено изпълнение на Дейностите по изработване на промоционалните материали, тъй като гарантират едновременно последователност и консистентност на информацията и общ графичен вид, с цел постигане на ефекта на надграждане и провокиране на интереса на целевите групи, както и гарантиране на разпознаваемост на всички продукти под един общ бранд.

Дейност 2.

2.1. Предложение за изпълнение на дейност 2.

В обхвата на дейност 3 е предвидено създаването на концепции за промоционалните материали, описани в самостоятелни под-дейности, отразявайки спецификата им спрямо вида продукт. За всяка от концепциите, основните цели адресират постигането на следните резултати:



2.1.1. Под-дейност 2.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 2.1.

Концепцията за създаване на мобилните приложения ще се изгради върху основната идея за промотиране на целите и резултатите от дейностите,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



извършени в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Тя ще бъде съобразена с разработените в рамките на проекта документи и които са проучени от Участника в предходните дейности. При разработването на концепцията за мобилните приложения ще бъдат определени аудиториите, към които ще бъде насочена информацията. Познаването на аудиторията в демографско и културно отношение ще бъде определящо за контекста на съдържанието, начина на представяне на информацията и визуализирането на мобилното приложение, което е в основата на една успешна апликация.

Фокусът на концепцията е образователният и опознавателен характер, съобразен с тематиката и целите за промотирането на проекта.



Чрез концепцията ще се подберат и идентифицират най-подходящите информационни формати, в които да бъде представена текстовата информация, съобразно спецификата на конкретното съдържание, UX елементите и всички останали детайли, разработени подробно в предложението по-долу.

Към всяка тема от съответния раздел ще бъде подбран илюстративният материал с високи художествени характеристики, професионално обработен и подходящо селектиран в синхрон с темата в съответния раздел. Всички използвани [REDACTED] и други материали ще бъдат с авторски права или с изрично споменаване на източника на материала. Ще бъдат идентифицирани и посочени надеждни и висококачествени източници за използване на допълнителен илюстративен материал - [REDACTED]

Като резултат, Участникът ще разработи и предложи 2 концепции за мобилни приложения, със следните възможности:

Интерактивно мултиезично мобилно приложение - български, румънски и английски език.

Мобилно приложение, съвместимо с най-разпространените операционни системи (Android, iOS, Microsoft, Blackberry):



Достъпно за свободно теглене, според възможностите на всеки собственик на портала за приложения;

Лесен за употреба и интуитивен, функционален интерфейс на мобилните приложения;

Възможност за гео локация и използване на интегрираните карти в приложението;



Възможност за внедряване на различни типове мултимедийни материали - в това число снимки, анимирани снимки, видео съдържание в определен за операционната система формат;

Съдържащо подробна и структурирана туристическа информация за обектите, включени в Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“;

Възможност за интеграция със социалните мрежи - в това число Facebook, Twitter и други;

Възможност за вграждане на интерактивна игра, насърчаваща потребителите да опознаят Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“;

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 2.1.

Изготвянето на концепция за мобилните приложения е от изключителна важност за постигане на поставената цел за промотиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Разработването на концепцията въз основа на организирането на различни теми създава предпоставки за лесно и безпроблемно използване на крайния продукт от потребителите, както и дава възможност за по-детайлно и структурирано представяне на информацията в мобилните приложения, използвайки различни информационни формати, качествен илюстративен материал, карти и общо представяне на резултатите от проекта на популярен и лесно разбираем от потребителите език. Прилагането на Концепцията ще гарантира проектирането и изпълнението на дейността по изработване на мобилните приложения с единна/идентична визия в различните езикови версии на продукта и общата проектна идентификация на продукта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.1.

Разработени 2 концепции за приложение за смартфон/ друго преносимо устройство

2.1.2. Под-дейност 2.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 2.2.

Екипът на Участника ще създаде 2 детайлни концепции за [REDACTED], която да бъде включена в мобилното приложение. Чрез концепцията ще бъде създадена основата за разработване на [REDACTED], която потребителите да ползват, така че да се привързват към мобилното приложение и целящо споделяне в социалните мрежи, така че да бъдат привлечени и нови потребители, за целите на промотирането на проекта.

В основата на разработката на Участника ще бъде идеята за създаване на [REDACTED], със заложените мултимедийните материали както за целия туристически маршрут, така и за представяне на конкретните обекти, включени в него и др. В основата на концепцията за [REDACTED]



_____, които ще бъдат извлечени на база на проучванията и запознаването на Участника с материалите от предишни поръчки.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 2.2.

_____ са един от основните стимули, които специалистите активно използват, за да увеличават броя на потребителите. В конкретния случай една такава _____, базирана на дигиталните технологии, създава много възможности за атракция на потребителите и задържането на техния интерес в приложението, както и да добави много нови познания за трансграничния регион.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.2.

Разработени 2 концепции за включена в приложението _____

2.1.3.Под-дейност 2.3. _____

Действия по изпълнение на под-дейност 2.3.

Концепцията за създаване на уебсайта ще се изгради върху основната идея за промотиране на целите и резултатите от дейностите, извършени в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Тя ще бъде съобразена с разработените в рамките на проекта документи и които са проучени от Участника в предходните дейности, както и тясно обвързана и синхронизирана с приложенията за смартфон. При разработването на концепцията за уебсайта ще бъдат определени аудиториите, към които ще бъде насочена информацията. Познаването на аудиторията в демографско и културно отношение ще бъде определящо за контекста на съдържанието, начина на представяне на информацията и визуализирането на уебсайта, което е в основата на една успешна интернет страница.

Чрез концепцията ще се подберат и идентифицират най-подходящите информационни формати, в които да бъде представена текстовата информация, съобразно спецификата на конкретното съдържание, UX елементите и всички останали детайли, разработени подробно в предложението по-долу.

Към всяка тема от съответния раздел ще бъде подбран илюстративният материал с високи художествени характеристики, професионално обработен и подходящо селектиран в синхрон с темата в съответния раздел. Всички използвани _____ и други материали ще бъдат с авторски права или с изрично споменаване на източника на материала, вкл. когато са предоставени от Възложителя. Ще бъдат идентифицирани и посочени надеждни и висококачествени източници за използване на допълнителен илюстративен материал - _____ и др.

Като резултат, Участникът ще разработи и концепция за уебсайта, със следните възможности:

Интерактивен мултиезичен уебсайт - български, румънски и английски език.

Възможност да бъдат интегрирани всички разработени в рамките на проекта документи и материали



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РУМЪНСКО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



Оптимизиран и бързо достъпен от най-разпространените търсещи машини;
Лесен за употреба и интуитивен, функционален интерфейс;
Възможност за внедряване на различни типове мултимедийни материали - в това число снимки, анимирани снимки, видео съдържание в определен за операционната система формат;
Възможност за интеграция със социалните мрежи - в това число Facebook, Twitter и други;

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 2.3.

Изготвянето на концепция за уебсайта е от изключителна важност за постигане на поставената цел за промотиране на проекта. Разработването на концепцията въз основа на организирането на различни теми създава предпоставки за лесно и безпроблемно използване на крайния продукт от потребителите, както и дава възможност за по-детайлно и структурирано представяне на информацията в уебсайта, използвайки различни информационни формати, качествен илюстративен материал, карти и общо представяне на резултатите от проекта на популярен и лесно разбираем от потребителите език. Прилагането на Концепцията ще гарантира проектирането и изпълнението на дейността по изработване на уебсайта с единна/идентична визия в различните езикови версии на продукта и общата проектна идентификация на продукта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.3.

Разработена концепция за уебсайт.

2.1.4.Под-дейност 2.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 2.4.

Концепцията за създаване на информационния филм за туристическия продукт ще се базира на основната идея за промотиране на целите и резултатите от дейностите, извършени в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Според минималните изискванията на Възложителя, в концепцията ще е заложено изработването на филмов материал, в който да бъдат представени отделни обекти в България и Румъния, включени в маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, като всеки обект е представен в кратко информационно видео, а всички те обединени в 120-минутен информационен филм. Елементите на филмовия материал следва да бъдат структурирани по начин, който позволява както самостоятелно, така и цялостно използване на готовия продукт. Създаденият по концепцията информационен филм трябва да отговаря на минимум следните технически параметри:

Формат на видео заснемане: Стандарт PAL, честота на кадрите: 25 кадъра/секунда, съотношение на страните на пикселите D1 / DVPAL (1.067)
Аудио: 48 кХц,
език: румънски, английски, български,
графично редактиране на заглавия, преходи,
обикновени видео ефекти,



монтаж на изображението,
обработка саундтрак, миксиране звук -
последваща обработка на глас и саундтрак,
снимки на закрито/ открито, минимум три места.

За да се гарантират и надградят описаните по-горе базови изисквания на Възложителя, при разработването на концепцията Консултантът ще се стреми да осигури механизми и да предложи похвати, гарантиращи високо качество. След като информацията създадена по проекта (предварително проучване и стратегии) бъде проучена, организирана и внимателно селектирана по полезност [REDACTED], ще има яснота по всички ключови елементи, необходими за изграждането на ясна концептуалност на изпълнението и за които към момента няма необходимата конкретика като:

[REDACTED]
Познаването на аудиторията в демографско и културно отношение, както и детайлното изучаване на цялостната информация за маршрута, ще позволи да се постигне специфика и индивидуализиране в концепцията.

Предоставената по проекта информация ще бъде основата при изготвянето на сценариите за отделните модули [REDACTED], а оттам и за информационния филм като цяло.

В основата на концепцията за информационен филм ще бъде поставено организирането на информационното съдържание и неговото аудио-визуално представяне чрез отделни модули - [REDACTED]

[REDACTED] маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Организирането на модулите ще бъде направено по начин, който предполага интегрирането им в обединен 120 минутен информационен филм за маршрута. Модулната структура ще улесни използването на продукта от крайните потребители и ще им помогне да се ориентират бързо в създаденото аудио-визуално съдържание спрямо конкретните си нужди и интереси.

Така структурираните модули ще дадат възможност за по-детайлно оформяне на съдържанието и намиране на пресечни точки при комбинирането на информацията за съществуващото „материално“ и „нематериално“ културно-историческо римско наследство на конкретния обект по туристическия маршрут и друга съпътстваща информация, като:

[REDACTED]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ПУБЛИЧНИ РАБОТИ




БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA




Interreg



Концепцията ще гарантира изработването на информационния филм в общ кампаниен стил, като приложи проектна идентификация чрез заставки с идентични логотипа, специално подбрани общи елементи и визуални идентификатори. Един от създадените модули ще представя всички промоционалните материали, изработени в рамките на поръчката - уеб сайт, мобилно приложение и интерактивна игра, информационен каталог и брошура. Концепцията на създадения филмов материал ще бъде съобразена с генерираните в рамките на проекта снимки, карти, видео и аудио-материали и др. и с целите на разработените по проекта стратегии.

Създадените видео материали ще отговарят на всички съвременни изисквания за висококачествено видео съдържание. С цел допълване на видео съдържанието ще се използват снимки, карти, анимация и от други надеждни източници и собствена видео-банка, като използваните материали ще бъдат с гарантирани авторски права или с изрично споменаване на източника на материала.

Чрез концепцията ще бъдат:



Аргументацията относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 2.4.

Изготвянето на концепция за информационен филм е от изключителна важност за постигане на поставената цел за промотиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Разработването на концепцията въз основа на структурирането на различни модули предоставя възможност крайният потребител да използва продукта лесно и да се ориентира бързо в съдържанието. Концепцията ще даде насоки и ще гарантира ефективен, ефикасен и качествен подход при



изработването на филмовия материал, дефинирайки най-важните етапи от производството на продукта. Прилагането на Концепцията ще гарантира проектирането и изпълнението на дейността по изработване на 120 минутен информационен филм за туристическия продукт с единна/идентична визия в различните езикови версии и общата проектна идентификация на продукта и ще гарантира качествено изпълнение на поръчката, надграждайки основните изисквания и очаквания на Възложителя.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.4.

Изработена концепция за 120 минутен информационен филм за туристическия продукт, съдържащ отделни модули.

2.1.5. Под-дейност 2.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 2.5.

Концепцията за създаване на информационния каталог ще се изгради върху основната идея за промотиране на целите и резултатите от дейностите, извършени в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Според минималните изисквания на Възложителя, концепцията ще бъде съобразена с разработените в рамките на проекта документи и ще използва

, създадени в рамките на същия, и такива, върху които притежава авторски права или ако е упоменал изрично източника на материала. Създаденият по концепцията информационен каталог трябва да отговаря на минимум следните технически параметри:

Да бъде в A4 размер в затворен формат, гланцирана хартия, 300:90, без ламинати, пълноцветен печат, 100 страници.

Да съдържа висококачествени снимки и текстова информация за обекти, включени в маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Да има специално изработен дизайн, съобразен с визуалната идентичност на проекта, одобрена от органите на Програмата

Да бъде отпечатан в тираж от 10,000 броя, разпределени както следва - 5 000 бр. на английски език, 2 500 броя на български език и 2 500 бр. на румънски език.

Основните цели на Концепцията адресират постигането на посочените по-горе базови изисквания на Възложителя и надграждат на основните му очаквания.

Концепцията за изработването на информационния каталог ще гарантира необходимото качество на крайния продукт.

След като информацията, предоставена по проекта бъде проучена, организирана и внимателно селектирана по полезност в дейност 1. и на база изработените предварително по проекта проучвания и стратегии, ще има яснота по всички ключови елементи, необходими за изграждането на ясна концептуалност на изпълнението и за които към момента няма необходимата конкретика като:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА



Interreg




Познаването на аудиторията в демографско и културно отношение, както и детайлното изучаване на цялостната информация за маршрута, ще ни позволи да бъдем специфични в контекста на това какво съдържание е необходимо да бъде предложено.

Предвид факта, че в основата на Концепцията ще стои организирането на многопластовото и разнородно по своята същност съдържание, основен приоритет ще бъде даден на концептуалното структуриране в представянето на продукта - тоест, организирането на наличната информация в разнообразни самостоятелни клъстери, които същевременно да бъдат интегрирани в общия за продукта стил.

Темата на всеки клъстер ще бъде базирана на конкретна тема от съдържанието, т.е. върху конкретен аспект на културните ресурси на материалното и нематериалното културно-историческо римско наследство, проучени в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ и заложили в разработените предварителни проучвания, Стратегия за развитие и маркетингова стратегия по проекта. В темите (където е уместно) ще бъдат интегрирани и обекти от природното наследство, намиращи се в рамките на конкретния туристически маршрут, но проучени по линия на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Разработването на информационния каталог по отделни теми дава възможност за създаване на структурирано съдържание, което предполага по-лесно използване от потребителите спрямо нуждите и интересите им.

Структурирането на съдържанието по теми/ клъстери/ ще става въз основа на многообразните интереси на целевата аудитория и характеристиките на маршрута. В рамките на одобреното съдържание дестинациите по маршрута могат да бъдат организирани като:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РИМСКО ПРЕДПРИЕТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО




Interreg



В допълнение на така създаденото и структурирано основно информационно съдържание, с цел изграждане на цялостен и единен туристически продукт, ще бъде подбрано подходящо съпътстващо такова - актуална информация за съществуващите и предоставяни по маршрута хотелски услуги и други услуги по настаняване, възможностите за изхранване, допълнителни услуги в различни области и др. (без да се допуска корпоративна реклама), които да създават предпоставки за пълно и многоаспектно запознаване и опознаване на туристическия продукт.

Така структурираните теми дават възможност за по-детайлно оформяне на съдържанието, което да надгради и детайлизира маршрута въз основа на комбиниране на информация за съществуващото „материално“ и „нематериално“ римско културно-историческо наследство, и допълнително съпътстващо съдържание в разнообразни информационни формати:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ЕВРОПЕЙСКО КОМИТЕТО




БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



[Handwritten signature]



Така създадените клъстър (теми) ще бъдат организирани чрез индекси въз основа на принципа на отличителна субординация, като всяка отделна тема, интерес и съпътстваща информация по този клъстър ще бъде [REDACTED], с цел по-лесно ориентиране на потребителя. Съответните индекси ще бъдат лесно разпознаваеми - [REDACTED]

Концепцията ще гарантира изработването на каталога в общ кампаниен стил, като приложи проектна идентификация чрез идентични логотипа, специално подбрани общи графични елементи, както и подробно представяне в атрактивен стил на всички продукти, резултат от изпълнението на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Ще бъдат предвидени и разработени специални [REDACTED] сегменти, които представят и промотират и всички материали, изработени в рамките на тази поръчка - уеб сайт, мобилно приложение [REDACTED], филм и брошура.

Чрез концепцията ще подберат и идентифицират най-подходящите информационни формати, в които да бъде представена текстовата информация, съобразно спецификата на конкретното съдържание. Към всяка тема от съответния клъстър ще бъде подбран илюстративен материал с високи

[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РУМЪНСКОТО МИНИСТЕРСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



художествени характеристики, професионално обработен и подходящо селектиран в синхрон с темата/кльстър в съответния раздел. Всички използвани [REDACTED] ще бъдат с авторски права или с изрично споменаване на източника на материала. Ще бъдат идентифицирани и посочени надеждни и висококачествени източници за използване на допълнителен илюстративен материал с гарантирани авторски права - [REDACTED]

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 2.5.

Изготвянето на концепция за информационен каталог е от изключителна важност за постигане на поставената цел за промотиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Разработването на концепцията въз основа на организирането на различни клъстери създава предпоставки за лесно и безпроблемно използване на крайния продукт от потребителите дава възможност за по-детайлно и структурирано представяне на информацията в каталога, използвайки различни информационни формати, качествен илюстративен материал, карти и общо представяне на резултатите от проекта на популярен и лесно разбираем от потребителите език. Прилагането на Концепцията ще гарантира проектирането и изпълнението на дейността по изработване на информационния каталог с единна/идентична визия в различните езикови версии на продукта и общата проектна идентификация на продукта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.5.

Изработена концепция за информационен каталог

2.1.6.Под-дейност 2.6.

Действия по изпълнението на под-дейност 2.6.

На база на основната концепция за информационния каталог ще бъде разработена концепцията за създаване на брошурата. Според основните изисквания на Възложителя за изработването на брошура, Концепцията ще осигури като минимум съобразяването на съдържанието и визуалните материали на брошурата с целите на разработените в рамките на проекта стратегии и ще гарантира изработването на специален дизайн за отпечатване при минимум следните технически параметри:

формат А4 размер, пълноцветна двустранна, корица картон гланц 205 - 300 гр/м², тяло - 15 листа хартия гланц 90-130 грама/м².

тираж от 30,000 броя, от които 15 000 бр. на английски език, 7 500 бр. на български език, 7 500 бр. на румънски език

Концептуалното структуриране на брошурата ще следва идентифицираните основни клъстери (теми), залегнали в концепцията за информационен каталог.



Предвид спецификата на информационния носител и формата на материала ще бъде акцентирано върху концентрираното представяне на туристическия продукт чрез по-потребителски ориентиран и рекламен подход.

Аргументацията относно действията, свързани с изпълнението на дейността:

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Изготвянето на [REDACTED] за брошура, базирана на информационния каталог е от изключителна важност за постигане на поставената цел за промотиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Връзката между [REDACTED] за информационния каталог и брошурата ще гарантира запазване на проектната идентичност и разпознаваемост на продуктите като част от един общ бранд, спазване на общата графична насоченост и консистентност на информационното съдържание, като същевременно модулира основното съдържание, придавайки му различна насоченост, комуникационна стойност и графична структура за постигане на по-голям ефект върху идентифицираните потребителски групи.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.6.

Изработена концепция за брошура.

2.1.7.Под-дейност 2.7. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 2.7.

Разработените концепции ще бъдат внесени, заедно с прилежащите им приложения (ако има такива) за разглеждане и одобрение от Възложителя. Обсъждането на концепциите може да стане и на работна среща с Възложителя (уточняване в хода на изпълнение на дейността), ако има необходимост от провеждането ѝ. При наличие на забележки или коментари от страна на Възложителя Концепциите ще бъдат коригирани и внесени отново за разглеждане. След одобрението на конкретна концепция ще се пристъпи към разработването на съответния продукт. Приложението за смартфон/ друго преносимо устройство и играта ще бъдат разработени по избрания вариант на концепция от Възложителя.

Аргументацията относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 2.7.

Внасянето на концепциите на Възложителя е свързано с получаване на обратна връзка относно етапа на планиране за изработване на промоционалните материали за маршрута за екотуризъм в трансграничния регион Румъния - България. Обсъждането с Възложителя ще допринесе за постигане на качествени резултати в рамките на проекта и последващо създаване на ефектен инструментариум за популяризиране на новосъздадения общ туристически продукт за региона.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 2.7.

Одобрени Концепции за разработване на промоционални материали



[Handwritten signature]

2.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

2.2.1. Взаимовръзка 7.

[Handwritten signature]

Взаимовръзка 7: Взаимообвързаност между създаването на обща концепция за единна визия и информационно съдържание за всички информационни материали [REDACTED] и създаването на концепция за информационен филм [REDACTED] и концепции за информационен каталог и брошура за туристически маршрут [REDACTED]

Качественото запознаване с основните документи и целите на разработените в рамките на проекта документи стратегии и генерирането на селектирана полезна информация е в тясна взаимовръзка с качествено разработване на концепциите, както и е основата за диференциране на различните теми/кълъстър/ и организиране на тяхното информационно съдържание. Прилагането на общите графични насоки ще гарантира концептуалната подготовка на продуктите с единна/идентична визия в различните езикови версии на всеки продукт и общата проектна идентичност на материалите.

2.2.2. Взаимовръзка 8.

Взаимовръзка 8: Взаимообвързаност между направена предварителна подготовка - разработените две концепции за мобилното приложение, [REDACTED] и уебсайт и самото разработване/изработване на тези промоционални материали

Разработването на мобилните приложения, вкл. уебсайт е процес, който се състои от много етапи, описани в обхвата на отделните дейности. За създаването на успешно мобилно приложение, което да изпълни целите си, като популяризира и ангажира потребителите с информация, графични и видео материали, предварителната подготовка и запознаване с цялата налична информация, начините на обезпечаване на тази информация, посоката на развитие на мобилните приложения (визуалната концепция) и т.н., са необходими и незаменими в процеса на работа. Те се осъществяват в единна взаимовръзка като за основа служи разработената концепция (под-дейност 2.1., 2.2. и 2.3.) за цялостния процес на разработка, описан в дейности 3, 4 и 5.

2.2.3. Взаимовръзка 9.

Взаимовръзка 9. Взаимообвързаност между изработената концепция за информационен каталог [REDACTED] и концепция за изработването на брошура [REDACTED]

Изготвянето на [REDACTED] за брошура, базирана на информационния каталог е от изключителна важност за постигане на поставената цел за промотиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Синхронът между [REDACTED] за

[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЪЩЕ



САМООПРАВЛЕНИЕТО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



информационния каталог и брошурата ще гарантира запазване на проектната идентичност и разпознаваемост на продуктите като част от един общ бранд, спазване на общата графична насоченост и консистентността на информационното съдържание.

2.2.4. Взаимовръзка 10.

Взаимовръзка 10. Взаимообвързаност между направените предварителни подготовки - разработени концепции за информационен филм [REDACTED], каталог [REDACTED] и брошура [REDACTED] и самото разработване/изработване на тези промоционални материали [REDACTED]

Изготвянето на концепциите е от изключителна важност за качествено изпълнение по изработката на тези материали. Разработването на концепциите гарантира изработването на висококачествени продукти, тяхното лесно и безпроблемно използване от потребителите и като осигурява детайлно и структурирано представяне на информацията в различни информационни формати, качествен илюстративен материал, карти и общо представяне на резултатите от проекта на популярен и лесно разбираем от потребителите език.

Дейност 3. [REDACTED]

3.1. Предложение за изпълнение на дейност 3.

В настоящата дейност в детайли са описани и всички под-дейности, които ще бъдат включени при разработката на мобилните приложения и в резултат на извършеното проучване, придобиване и прилагане на резултатите от изследванията и проучванията в рамките на [REDACTED]

На база на материалите и информацията, предоставена от Възложителя, Участникът ще се направят детайлни проучвания и запознае с всички налични документи и анализи, с които Възложителят разполага.

При провеждането на проучването и анализа на текущото състояние и данните получени в процеса на работа от предходните дейности и поръчки, като допълнение ще се създаде програма и методика за тестване и внедряване на решението, заложено в плана, целящо да верифицира работоспособността на продукта.

Ще се създаде устойчивост при разработването на продукта, като се следват добрите примери и практики внедрени и използване в някои от най-добрите и модерни туристически места.

След подробното запознаване на екипа на Участника с поставените задачи и направените оценки, ще се изпълнят описаните по-долу под-дейности.

3.1.1. Под-дейност 3.1. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 3.1.



Стратегическият анализ ще покаже посоката на развитие на продукта, както и неговото поетапно разработване и внедряване, което Участникът ще следва. Участникът ще създаде [REDACTED] по проекта, по екипно и за всеки един от екипа, използвайки и базирайки се изцяло на [REDACTED] за работа при разработка на софтуерни и мобилни решения. [REDACTED] използва итеративен, инкрементален подход за оптимизиране на предсказуемостта и контрол на риска.

Схема 1.



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.1.

Изготвеният [REDACTED] ще даде ясна визия и ще следва всички изисквания заложи в проектното предложение, така че Участникът да създаде желаното мобилно приложение в срокове и бюджет, посочени в офертата.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.1.

Изработен детайлен [REDACTED] разделен по функционални звена и експерти

3.1.2. Под-дейност 3.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 3.2.

В тази стъпка ще бъде създадена технологична спецификация и изработка на детайлна конструкция на продукта [REDACTED], по която ще се разработват графичния дизайн, функционалния и други, засегнати в следващата дейност.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.2.

Спецификацията и конструкцията на продукта са в основата на един успешен проект, следвайки целеполагането и пазарната ниша. Създаването на детайлната предварителна спецификация и конструкция на проекта ще даде яснота при преминаването през следващите под-дейности, защото те изцяло се базират на тази основа. Конструкцията на мобилното приложение е в основата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



на създаването на една успешна апликация, тъй като тя засяга най-важните неща - информационните потоци, визуални елементи и т.н.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.2.

Разработена детайлна спецификация и конструкция на мобилното приложение

3.1.3.Под-дейност 3.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 3.3.

Разработване на детайлни функционални спецификации, технологичен дизайн на базата на проучванията и резултатите от концепцията, засегнати в предходните дейности.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.3.

Функционални спецификации на продукта, ще бъдат създадени след ясно подредената конструкция и предварителна спецификация от предходната дейност, чрез която са били анализирани и създадени моделите за работа, описани бизнес процесите, както и методиката по която екипът ще разработва продукта. Именно тези описани процеси, рамки, възможности и действия на мобилното приложение са най-значимото и важно нещо при последващата стъпка, а именно разработването и внедряването на мобилното приложение.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.3.

Разработена функционална спецификация на мобилното приложение, на база на посочените изисквания от Възложителя

3.1.4.Под-дейност 3.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 3.4.

Системният дизайн и неговата динамичност и интелигентност са в корените на разработването на нашето решение, а именно създаването на една интерактивна мултиезична мобилна апликация. От технологична гледна точка, този етап е основен, защото създава технологичния модел, инфраструктурен и логически как всички елементи и обекти в системата ще бъдат обвързани и ще си комуникират помежду си - апликейшън сървър, комуникационен и т.н.

Като допълнение ще бъдат изработени няколко динамични модела на инфраструктурата, така че продукта да може да бъде внедрен в различни технологични среди и според изискванията за сигурност на всеки потенциален клиент.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.4.

Системният дизайн е важна част от процеса по изработка на софтуерни и мобилни решения, тъй като той показва всички технологични и системни връзки с други и външни ресурси - например

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.4.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Изработен системен дизайн на мобилното приложение и апликациите и инфраструктурно технологично решение.

3.1.5.Под-дейност 3.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 3.5.

Изследвайки дейностите свързани с бизнес процесите засегнати в проекта и като допълнителна дейност, надграждаща процеса описан в [REDACTED], екипът ще има като резултат и ясна визия за графичното изражение и структура на мобилното приложение.

Целта на визуалната концепция е максимално да даде свобода и действия на използващите системата чрез:

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.5.

Основен фактор за доброто възприемане на мобилното приложение е именно неговата визия, потребителските възможности и подхода на реализация и визуализиране на данните. Това е важна част от създаването на мобилното приложение и неминуемо е един от основните етапи при работата ни.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.5.

Предложение за концепция за графична визуална концепция и графичен дизайн за мобилните приложения.

3.1.6.Под-дейност 3.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 3.6.

В тази дейност, екипът ще разработи мобилните приложения, следвайки подготвените функционални спецификации, системен дизайн, визуални концепции и други.

Създаване на базисен прототип на технологията върху, която екипът ще разработва мобилното приложение и ще интегрира цялата информация необходима за постигането на резултатите заложи в поръчката.

За успешната работа по разработката, екипът ще следва [REDACTED]

[REDACTED], като модулира и разбие разработката на малки стъпки, през които лесно и по-ефективно ще преминават и всички тестове изредени по-долу.

Логическата подредба на всяка дейност по-долу ще бъде съобразена с плановите и методологията, което ще изработим в предходните дейности.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.6.

Предложеният подход за разработка, методологията по която Участникът ще реализира мобилните приложения е един от най-успешните и прилагани се в съвременното софтуерно инженерство модел на работа. При създаването на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



малките стъпки в разработката на приложенията, екипът винаги ще има работещо, в различните етапи от развитието си, мобилно приложение, като тестовите в т. 3.7. ще бъдат провеждани поетапно – описани по-долу.


Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.6.

Изработено основно технологично ядро за работа на мобилните приложения, създаване на мобилните приложения готови за провеждане на тестове

3.1.7. Под-дейност 3.7. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 3.7.

Базирайки се на методологията за софтуерно инженерство [REDACTED], описана по-горе, екипът на Участника ще премине през следните фази на тестове при разработката на всеки един елемент от решението:



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.7.

Провеждането на поетапни тестове при разработването на мобилните приложения е много важна част, която цели намаляването на времето на разработка, намаляване на риска от технически проблеми и подобрява технологичното решение, постоянното следене на работата и качествен контрол.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.7.

Проведени функционално, потребителски, достъпни и тестове за сигурност на приложението

3.1.8. Под-дейност 3.8. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 3.8.

Техническият екип се запознава с детайлите по проведените тестове и предприема коригиращи действия, които ще допълнят и финализират процеса на разработката.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 3.8.

Важна част от процеса по тестване на софтуерни решения са именно анализ от тях, това дава допълнителна яснота и за възможни рискове, модели за справяне с възникнали рискове и ясна и предвидима визия за мобилните приложения.



Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 3.8.
Изготвен анализ на резултатите от проведените тестове

3.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

3.2.1.Взаимовръзка 11.

Взаимовръзка 11: Взаимообвързаност между разработването на функционални спецификации [REDACTED] и системния дизайн [REDACTED]

Основата на успешната разработка на мобилните приложения е ясно разработената функционална спецификация и предложения системен дизайн. В основата на разработката на приложенията лежи системния дизайн, който е връзката между интерфейса и функционалността/възможностите на приложението. Именно тази взаимнообвързаност е един от най-важните елементи, тъй като това полага основите на изграждането на мобилните приложения. Системния дизайн зависи изцяло от функционалната спецификация.

3.2.2.Взаимовръзка 12.

Взаимовръзка 12: Взаимообвързаност между създаването на визуалната концепция, разработката на графичен дизайн на мобилните приложения и разработката на мобилните приложения


Визуалната концепция е фокусът на потребителите. Това е нещото, което първо вижда всеки един и това с което той ще борави ползвайки мобилното приложение [REDACTED]. При изграждането на мобилните приложения [REDACTED], голяма част от изпълнението, е именно визуалната концепция и графичния дизайн, които създават връзката на функционалността, системния дизайн (хардуера и софтуера на телефона или мобилното устройство) и потребителя. В концепциите за графичния дизайн са включени и основните елементи - [REDACTED]

[REDACTED] който е подходящ и действащ без никакво замисляне - елементи, които биват изразени при разработването на мобилните приложения.

3.2.3.Взаимовръзка 13.

Взаимовръзка 13: Взаимообвързаност между разработването на функционални спецификации [REDACTED] и разработката на мобилните приложения [REDACTED]

Функционалните спецификации са основата на мобилното приложение - това, са всички възможности, взаимовръзки и детайли на работата на приложението.



В основата на тези спецификации стоят възможностите, които приложението следва да има - например [REDACTED], които следва да бъдат разработени и внедрени в приложението. Мобилното приложение е съчетание на графичния дизайн, функционалностите и системния дизайн, които трябва да се заложат при работата върху разработката на мобилните приложения.

3.2.4. Взаимовръзка 14.

Взаимовръзка 14: Взаимообвързаност между провеждането на тестове [REDACTED] и разработката на мобилните приложения [REDACTED]

За успешно разработено и внедрено мобилно приложение, тестовите по време на разработване са неизменна част.

В основата на работата по [REDACTED], всяка стъпка завършва с тестове, така по този начин при разработването на мобилното приложение, ще имаме винаги завършени модули, а на финала и цялостно разработено решение. Провеждането на тестове - [REDACTED] показват и преминават през всички нива на разработване до пълно функциониращото мобилно приложение, готово за публикуване.

3.2.5. Взаимовръзка 15.

Взаимовръзка 15: Взаимообвързаност между оценката и анализа на резултатите от проведените тестове [REDACTED] и разработката на мобилните приложения [REDACTED]

Провеждането на тестове цели да валидира изцяло функционалната спецификация, системния дизайн и разработената и внедрена графична и визуална концепция, внедрени в процеса на разработка на мобилните приложения. Цялостната оценка и анализ на резултатите от тестовите ще покаже и резултатите от разработката на мобилните приложения и поставените в началото цели на проекта.

Дейност 4. [REDACTED]

4.1. Предложение за изпълнение на дейност 4.

4.1.1. Под-дейност 4.1. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 4.1. (надграждаща)

В процеса на работа по изработка на [REDACTED], Участникът ще разработи и съответстващи те контролни механизми и ще предложи предписания относно законосъобразността и.

Това е важна част от [REDACTED], тъй като предлага възможности на потребителите на мобилното приложение, което за да бъде успешно прието и публикувано от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО АГЕНСТВО



Interreg



официалните места (AppStore, Google Play и т.н.) е необходимо и е неизменна част от всяко приложение, което има в себе си и [REDACTED] характер.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 4.1.

За целта на успешните мобилни приложения и ясна и прозрачна концепция на игрите, Участникът разработва регламент на играта и контролни процедури, които са задължителни при публикуване, както и от гледна точка на права и собственост върху съдържанието, не носене на отговорност за действията на потребителите и др.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 4.1.

Разработен регламент на [REDACTED] и правила за законосъобразност.

4.1.2. Под-дейност 4.2. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 4.2.

След избор от страна на Възложителя, Участникът ще предприеме действията по проектиране и разработване на избраната концепция в мобилното приложение, като следва плана за работа предоставен в предходните точки. При изпълнението на под-дейността ще бъдат изпълнени всички стъпки описани в дейност 3.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 4.2.

Участникът обръща изключително голяма внимание на този етап от работата при реализирането на [REDACTED], защото той определя бъдещето на проекта. Още в самото начало ще бъдат разработени решения, които не просто копират някои познати варианти на [REDACTED], ами ги доразработват по начин, който да отговаря на нуждите на проекта и който ще привлече вниманието на нови потребители.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 4.2.

Разработена интерактивна [REDACTED]

4.1.3. Под-дейност 4.3. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 4.3. (надграждаща)

Като част от разработването на [REDACTED] и последваща дейност, Участникът ще предложи план за популяризиране на избраната концепция на [REDACTED], като част от мобилното приложение.

Популяризирането включва основни маркетингови дейности, технически и технологични предложение, целящи създаването на вирусен ефект и привързаност към [REDACTED]. Технологични предложения като споделяне на резултати в социалните мрежи, покана на приятели, или дори състезателен характер, който да принуждава потребителите да бъдат по-заинтересовани от [REDACTED].

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 4.3.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



Целта на [REDACTED] е не само да създава допълнителни познания, но и да бъде атрактивна част от мобилното приложение, така че потребителите да искат да използват повече и повече информацията. [REDACTED] на мобилното приложение ще придаде огромен ефект върху цялата концепция за популяризирането на проекта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 4.3.

Разработен план за популяризирането на [REDACTED]

4.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

4.2.1.Взаимовръзка 16.

Взаимовръзка 16: Взаимообвързаност между разработването на концепция за интерактивната игра [REDACTED] и разработването на регламент на играта и контролиране на законосъобразността ѝ [REDACTED]. При разработването на детайлната концепция за [REDACTED], Участника взема предвид и правната регулация на порталите за публикуване на мобилните приложения, изискванията и законосъобразността ѝ. Регламентът на [REDACTED] кратко представяне на концепцията за [REDACTED], целящо по-бързото и успешно публикуване на приложенията в порталите, като това е и неизменна част от условията за ползване и прилагане на мобилните приложения.

4.2.2.Взаимовръзка 17.

Взаимовръзка 17: Взаимообвързаност между разработването на детайлна концепция за интерактивната игра [REDACTED] и разработването на играта [REDACTED]. Концепцията на [REDACTED] ще бъде съобразена и с техническите и технологични, визуални и потребителски и правни изисквания. На база на разработената концепция на [REDACTED], ще бъде разработена и [REDACTED] и внедрена в мобилните приложения.

4.2.3.Взаимовръзка 18.

Взаимовръзка 18: Взаимообвързаност между разработването на план за популяризиране на играта [REDACTED] и разработване на концепцията за интерактивната игра [REDACTED]. При разработването на концепцията за [REDACTED], Участникът ще съобрази и предложи план за популяризиране на [REDACTED], според възможностите на мобилните устройства и на база на всички функционалности, предложени в концепцията на мобилното приложение. Двете дейности са пряко обвързани и целят успешното създаване и популяризиране на мобилното приложение.

Дейност 5. [REDACTED]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



5.1. Предложение за изпълнение на дейност 5.

В настоящата дейност в детайли са описани и всички под-дейности, които ще бъдат включени при разработването на динамичен уебсайт с възможност за бърз достъп до всякаква информация, свързана с проекта и в резултат на извършеното проучване, придобиване и прилагане на резултатите от изследванията и проучванията в рамките на Дейност 1.

На база на материалите и информацията, предоставена от Възложителя, Участникът ще се направят детайлни проучвания и запознае с всички налични документи и анализи, с които Възложителят разполага.

При провеждането на проучването и анализа на текущото състояние и данните получени в процеса на работа от предходните дейности и поръчки, като допълнение ще се създаде програма и методика за тестване и внедряване на решението, заложено в плана, целящо да верифицира и работоспособността на продукта.

Ще се създаде устойчивост при разработването на продукта, като се следват добрите примери и практики внедрени и използване в някои от най-добрите и модерни туристически места.

След подробното запознаване на екипа на Участника с поставените задачи и направените оценки, ще се изпълнят описаните по-долу под-дейности.

5.1.1. Под-дейност 5.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 5.1.

Стратегическият анализ ще покаже посоката на развитие на уебсайта, както и неговото поетапно разработване и внедряване, което Участникът ще следва.

Участникът ще създаде детайлен план за работа по проекта, по екипно и за всеки един от екипа, използвайки и базирайки се изцяло на [REDACTED]

[REDACTED] за работа при разработка на софтуерни и мобилни решения.

[REDACTED] използва итеративен, инкрементален подход за оптимизиране на предсказуемостта и контрол на риска.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA

Interreg



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.1.

Изготвеният план за работа ще даде ясна визия и ще следва всички изисквания заложиени в проектното предложение, така че Участникът да създаде уебсайта в сроковете и бюджет, посочени в офертното предложение.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.1.

Изработен детайлен план за работа, разделен по функционални звена и експерти

5.1.2.Под-дейност 5.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 5.2.

В тази стъпка ще бъде създадена технологична спецификация и изработка на детайлна конструкция на продукта [REDACTED], по която ще се разработват графичния дизайн, функционалния и други, засегнати в следващата дейност.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.2.

Спецификацията и конструкцията на продукта са в основата на един успешен проект, следвайки целеполагането и пазарната ниша. Създаването на детайлната предварителна спецификация и конструкция на проекта ще даде яснота при преминаването през следващите под-дейности, защото те изцяло се базират на тази основа. Конструкцията на уебсайта е в основата на създаването на една успешна интернет страница, тъй като тя засяга най-важните неща - информационните потоци, визуални елементи и т.н.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.2.

Разработена детайлна спецификация и конструкция на уебсайта [REDACTED].

5.1.3.Под-дейност 5.3. Разработване на функционални спецификации

Действия по изпълнение на под-дейност 5.3.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



[Handwritten signature]

Разработване на детайлни функционални спецификации, технологичен дизайн на базата на проучванията и резултатите от концепцията, засегнати в предходните дейности.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.3.

Функционални спецификации на динамичния уебсайт с възможност за бърз достъп до всякаква информация, свързана с проекта, ще бъдат създадени след ясно подредената конструкция и предварителна спецификация от предходната дейност, чрез която са били анализирани и създадени моделите за работа, описани бизнес процесите, както и методиката по която екипът ще разработва продукта. Именно тези описани процеси, рамки, възможности и действия които уебсайта ще покрие са най-значимото и важно нещо при последващата стъпка, а именно разработването и внедряването на уебсайта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.3.

Разработена функционална спецификация на уебсайта, на база на посочените изисквания от Възложителя

5.1.4.Под-дейност 5.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 5.4.

Системният дизайн и неговата динамичност и интелигентност са в корените на разработването на нашето решение, а именно създаването на една интерактивна мултиезична уеб страница. От технологична гледна точка, този етап е основен, защото създава технологичния модел, инфраструктурен и логически как всички елементи и обекти в системата ще бъдат обвързани и ще си комуникират помежду си - апликейшън сървър, комуникационен и т.н. Като допълнение ще бъдат изработени няколко динамични модела на инфраструктурата, така че продукта да може да бъде внедрен в различни технологични среди и според изискванията за сигурност на всеки потенциален клиент.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.4.

Системният дизайн е важна част от процеса по изработка на софтуерни и мобилни решения, тъй като той показва всички технологични и системни връзки с други и външни ресурси - например

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.4.

Изработен системен дизайн на уебсайта и инфраструктурно технологично решение.

5.1.5.Под-дейност 5.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 5.5.

Изследвайки дейностите свързани с бизнес процесите, засегнати в проекта и като допълнителна дейност, надграждаща процеса, описан в Дейност 1, екипът



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РАСПОРЕДБИТЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA-BULGARIA



Interreg



ще има като резултат ясна визия за графичното изражение и структурата на уебсайта.

Целта на визуалната концепция е максимално да даде свобода и действия на използващите системата чрез:

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.5.

Основен фактор за доброто възприемане на уебсайта е именно неговата визия, потребителските възможности и подхода на реализация и визуализиране на данните. Това е важна част от създаването на динамичен уебсайт и неминуемо е един от основните етапи при работата ни.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.5.

Предложение за концепция за графична визуална концепция и графичен дизайн за уебсайта.

5.1.6.Под-дейност 5.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 5.6.

В тази дейност, екипът ще разработи уебсайта, следвайки подготвените функционални спецификации, системен дизайн, визуални концепции и други. Създаване на базисен прототип на технологията върху, която екипът ще разработва уебсайта и ще интегрира цялата информация необходима за постигането на резултатите заложи в поръчката.

За успешната работа по разработката, екипът ще следва

, като модулира и разбие разработката на малки стъпки, през които лесно и по-ефективно ще преминават и всички тестове изредени по-долу.

Логическата подредба на всяка дейност по-долу ще бъде съобразена с плановите и методологията, което ще изработим в предходните дейности.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.6.

Предложеният подход за разработка, методологията по която Участникът ще реализира уебсайта е един от най-успешните и прилагачи се в съвременното софтуерно инженерство модел на работа. При създаването на малките стъпки в разработката на приложенията, екипът винаги ще има работещ, в различните етапи от развитието си, уебсайт, като тестовете в т. 5.7. ще бъдат провеждани поетапно - описани по-долу.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.6.

Изработено основно технологично ядро за работа на уебсайта, създаване на уебсайта готов за провеждане на тестове

5.1.7.Под-дейност 5.7.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



Действия по изпълнение на под-дейност 5.7.

Базирайки се на [REDACTED], описана по-горе, екипът на Участника ще премине през следните фази на тестове при разработката на всеки един елемент от уебсайта:



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.7.

Провеждането на поетапни тестове при разработването на уебсайта е много важна част, която цели намаляването на времето на разработка, намаляване на риска от технически проблеми и подобрява технологичното решение, постоянното следене на работата и качествен контрол.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.7.

Проведени функционално, потребителски, достъпни и тестове за сигурност на уебсайта.

5.1.8. Под-дейност 5.8.

Действия по изпълнение на под-дейност 5.8.

Техническият екип се запознава с детайлите по проведените тестове и предприема коригиращи действия, които ще допълнят и финализират процеса на разработката.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 5.8.

Важна част от процеса по тестване на софтуерни решения са именно анализ от тях, това дава допълнителна яснота и за възможни рискове, модели за справяне с възникнали рискове и ясна и предвидима визия за уебсайта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 5.8.

Изготвен анализ на резултатите от проведените тестове

5.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

5.2.1. Взаимовръзка 19.

Взаимовръзка 19: Взаимообвързаност между разработването на функционални спецификации [REDACTED] и системния дизайн [REDACTED]



Основата на успешната разработка на уебсайта е ясно разработената функционална спецификация и предложения системен дизайн. В основата на разработката на уебсайта лежи системният дизайн, който е връзката между интерфейса и функционалността/възможностите на уебсайта. Именно тази взаимнообвързаност е един от най-важните елементи, тъй като това полага основите на изграждането на интернет страницата. Системния дизайн зависи изцяло от функционалната спецификация.

5.2.2. Взаимовръзка 20.

Взаимовръзка 20: Взаимообвързаност между създаването на визуалната концепция, разработката на графичен дизайн на уебсайта [REDACTED] и разработката на уебсайта [REDACTED]

Визуалната концепция е фокусът на потребителите. Това е нещото, което първо вижда всеки един и това с което той ще борави ползвайки уебсайта. При изграждането на интернет страницата, голяма част от изпълнението, е именно визуалната концепция и графичния дизайн, които създават връзката на функционалността, системния дизайн (хардуера и софтуер на решението) и потребителя. В концепциите за графичния дизайн са включени и основните елементи - [REDACTED]

[REDACTED] който е подходящ и действащ без никакво замисляне - елементи, които биват изразени при разработването на този динамичен интерактивен уебсайт.

5.2.3. Взаимовръзка 21.

Взаимовръзка 21: Взаимообвързаност между разработването на функционални спецификации [REDACTED] и разработката на уебсайта [REDACTED]

Функционалните спецификации са основата на уебсайта - това са всички възможности, взаимовръзки и детайли на работата на интернет страницата.

В основата на тези спецификации стоят възможностите, които уебсайта следва да притежава - например [REDACTED]

[REDACTED], които следва да бъдат разработени и внедрени в него. Интернет страницата е съчетание на графичния дизайн, функционалностите и системния дизайн, които трябва да се заложат при разработката му.

5.2.4. Взаимовръзка 22.

Взаимовръзка 22: Взаимообвързаност между провеждането на тестове [REDACTED] и разработката на уебсайта [REDACTED]

За успешно разработен и внедрен уебсайт, тестовите по време на разработване са неизменна част.

В основата на работата по [REDACTED], всяка стъпка завършва с тестове, така по този начин при разработването на уебсайта, ще имаме винаги завършени модули, а на финала и цялостно разработено решение.



Провеждането на тестове - [REDACTED] показват и преминават през всички нива на разработване до пълно функциониращ уебсайт, готов за публикуване.

5.2.5. Взаимовръзка 23.

Взаимовръзка 23: Взаимообвързаност между оценката и анализа на резултатите от проведените тестове [REDACTED] и разработката на уебсайта [REDACTED]

Провеждането на тестове цели да валидира изцяло функционалната спецификация, системния дизайн и разработената и внедрена графична и визуална концепция, внедрени в процеса на разработка на уебсайта. Цялостната оценка и анализ на резултатите от тестовете ще покаже и резултатите от разработката на уебсайта и поставените в началото цели на проекта.

Дейност 6. [REDACTED]

6.1. Предложение за изпълнение на дейност 2.

Дейностите по изработването на информационния филм ще са базирани на насоките, принципите и изискванията, залегнали и поставени в Концепцията, създадена в рамките [REDACTED]

6.1.1. Под-дейност 6.1. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 6.1. (надграждаща)

Действията по изпълнението на тази под-дейност включват:
подбор и структуриране на задълженията на екипа по изработка на филма [REDACTED]

дефиниране на целите на филма и запознаване на екипа със спецификите им, както и с възможностите и начините за постигането им;
дефиниране на обща продължителност на филма от 120 минути, и определяне на продължителността на отделните модули [REDACTED]
съобразно общата продължителност на филмовия материал;
избор на формат на видео заснемане и аудио запис, отговорящи на заложените от Възложителя изисквания: Стандарт PAL, честота на кадрите: 25 кадъра/секунда, съотношение на страните на пикселите D1 / DVPAL (1.067)
Аудио: 48 кХц, и обезпечаващ високо качество на крайния информационен продукт;
избор на технически похвати за привличане и задържане на вниманието на целевата група - [REDACTED]

идентифициране на аудиторията на крайния информационен продукт;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



синтезиране на желания ефект, който да бъде постигнат от чрез информационния филм, а именно създаване на въздействащ аудио-визуален информационен продукт, показващ разнообразието на маршрута в пълнота, по атрактивен и въздействащ на сетивата начин, достъпен и разбираем за целевата аудитория на продукта.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.1.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Подготовката за изработката на информационния филм е основополагаща за постигането висококачествен краен продукт, съответстващ изцяло на заложените в проекта цели и постигане на краен ефект от така създадения материал.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.1.

Синтезиран документ, включващ разпределението на дейностите в екипа и обща базова информация за проекта.

6.1.2. Под-дейност 6.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.2.

Разработването на сценарий за заснемане на информационния филм се осъществява на база одобрената концепция за филма. Така разработеният сценарий обединява изходната информация и определя същината на филма, осигурявайки визуален гайдлайн за изработването му. Сценарият ще бъде концептуално кореспондиращ на основните насоки, заложен в концепцията по изработване на информационния филм, описателен, но същевременно ще оставя възможност за включване на допълнителни елементи и нанасяне на корекции в хода на изпълнението на дейностите. Сценарият ще бъде изграден на база факти и проверена и селектирана информация. При изработката на сценария ще се вземат под внимание:

Сценарият ще определи какви точно визуални елементи ще залегнат в основата на филма

Сценарият ще определи и аудио-елементите - , като в тази под-дейност ще бъдат създадени и първоначалните текстови варианти на дикторския текст на български език.

Структурата на сценария ще съдържа следните елементи:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



Изготвеният сценарий се предоставя на Възложителя за коментари и корекции, след отстраняването на които сценарият бива финално одобрен от Възложителя.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.2.

Изготвянето на сценарий за заснемането на информационния филм и отделните модули, включени в него, е отправна точка за работата на екипа в следващите под-дейности и структурира и извежда всички необходими елементи, които да гарантират изработването на качествен краен аудио-визуален продукт.


Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.2.

Разработен и финално одобрен от Възложителя сценарий за заснемане на информационен филм.

6.1.3.Под-дейност 6.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.3. (надграждаща дейност и технически параметри)

С действията по тази дейност ще бъдат обезпечени:



Като елементи на творческото планиране в тази под-дейност ще да бъдат определени:



www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ОПРАВОУВАНО ПРАВИТЕЛСТВО




БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО


ROMANIA - BULGARIA



Interreg



Като отделни елементи на техническото планиране в тази под-дейност ще се идентифицират:



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.3.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Елементите, включени в тази под-дейност позволяват синхронизиране между заложи в сценария основни позиции и елементи и техническите дейности, необходими за постигането на краен резултат - високо качествено аудио-визуален продукт.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.3.


Разработен творческо-технически сценарий

6.1.4.Под-дейност 6.4.



Действия по изпълнение на под-дейност 6.4. (надграждаща)

Действията по логистично-административно планиране на филма включват:





Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.4.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Тази под-дейност е ключов момент при планиране на снимачния период и осигуряване на техническата и логистична обезпеченост на заснемането.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.4.

Изготвен график за снимачния период

6.1.5.Под-дейност 6.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.5. (надграждаща)

Разработването на [REDACTED] има за цел изграждане на общ изглед както на филма, така и на отделните му модули. Чрез създаването на [REDACTED] се начертават основните и допълнителните елементи в модулите и филма. Тази под-дейност помага за организацията на работата по заснемането и подпомага подбора на правилните начини за заснемане с цел максимално съответствие с резултатите от творческото - техническото планиране по [REDACTED]

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.5.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Създадените в тази под-дейност [REDACTED] ще подпомогнат процеса за организация на работата при заснемане на информационния филм чрез оптимизация на снимачния процес и организиране на информацията за отделните видове кадри [REDACTED]

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.5.

6.1.6.Под-дейност 6.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.6. (надграждащи технически параметри)

Въз основа на изработения в под-дейност [REDACTED] се набелязват и определят локациите, които ще бъдат заснети (минимум 5 места - надграждане), както и типа локации - закрити/ открити. В тази под-дейност се включва и подготовка на участниците в заснемането, като с тях се провеждат предварителни разговори, обсъжда се сценария, диалозите, определя се езика на представянето им, осъществяват се репетиции. След провеждане на подготовката и организиране на екипа, започват снимки на локация. Снимките се реализират на база изготвения график за снимачния период в [REDACTED]



[Handwritten signature]

■ След приключване на същинското заснемане, целият заснет материал се съхранява.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.6.

Дейностите, осъществени в рамките на тази дейност са от ключово значение за получаването на висококачествен изходен видео материал, който ще послужи за създаването на крайния продукт. Техническите характеристики по изпълнението на тази дейност надграждат и превъзхождат изискванията на Техническата спецификация.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.6.

Заснет висококачествен филмов материал

6.1.7.Под-дейност 6.7.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.7.

Тази под-дейност предвижда допълване и надграждане на вече изработения сценарий за заснемане. Изработката на сценария за монтаж е основополагащ за осъществяване на под-дейност 6.9. С него се определят както броят на кадрите и тяхната продължителност, така и финалният текст за дикторския глас на български език. На база на финално одобрения текст за дикторски глас на български език от Възложителя се изработват версиите му на съответните други езици - английски и румънски.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.7.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Дейността е важна за осигуряване на качествен и съобразен със заснетия филмов материал краен продукт. Сценарият за монтаж надгражда създадения сценарий за заснемане. Сценарият за монтаж включва и финално изработване и потвърждение на текста за дикторски глас на български език и превеждането му на английски и румънски език.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.7.

Сценарий за монтаж и одобрен финален текст за дикторски глас в три езикови варианта - английски, български и румънски.

6.1.8.Под-дейност 6.8.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.8.

Изпълнението на тази под-дейност включва:

■



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.8.

Качественият подбор и изработка на аудио-визуалните елементи на информационния филм е ключов за информационната стойност и постигането на завършен вид на продукта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.8.

Одобрени от Възложителя саундтрак и дикторски гласове за различните езикови версии на информационния филм

6.1.9.Под-дейност 6.9.

Действия по изпълнение на под-дейност 6.9.

Посочената под-дейност включва всички действия (етапи), които предшестват предаването на готовия информационен продукт:

Първи (груб) монтаж - включващ: монтаж на отделни сцени или поредица от сцени спрямо търсените внушения и динамика на крайния информационен продукт. Този монтаж се осъществява на база сценария.

След като е готов първият (груб) монтаж, той се изпраща за коментари и корекции от страна на Възложителя. След отстраняването им се преминава към следващия етап:

Втори монтаж - включващ: по-детайлен монтаж на кадрите, влагане на звук - саундтрак и дикторски глас, миксиране на звук, поставяне на визуални и видео ефекти, добавяне на моушън графика, обработване на снимки, карти, анимация и други материали.

Резултатът от втория монтаж се предоставя на Възложителя за коментари и корекции, които се отразяват в следващия етап:

Трети монтаж - включващ: отстраняване на коментари и корекции по изработения втори монтаж.

След финализиране на третия монтаж, той се предоставя на Възложителя за одобрение. След получаване на одобрение за него, се пристъпва към

Цветови корекции, които имат две основни цели:

Поправки - изравняване и уеднаквяване на цветовите стойности на различните кадри;

Творчески корекции на цветовете с цел постигане на запомняща се визия;

След нанасяне на цветовите корекции се пристъпва към:

Финален монтаж, представляващ - финална обработка на аудио-визуалния продукт с цел постигане на баланс между звук и картина и баланс на звука между гласове - саундтрак и обща сила на звука.

Предоставяне на последната версия за съгласуване с Възложителя и отразяване на върнати от негова страна коментари и корекции

Създаване на версии на различните езици - български, английски и румънски.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 6.9.

Техническите характеристики по изпълнението на тази дейност надграждат и превъзхождат изискванията на Техническата спецификация. Качественото изпълнение на дейностите по постпродукцията са гаранция за висококачествен



краен продукт, който е съобразен с изискванията на Възложителя и стандартите при изработката на аудио-визуални произведения. Съдържащите се в процеса етапи гарантират изработка на качествен краен продукт.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 6.9.

Одобрени от Възложителя мастер копия на три езикови версии на информационния филм - българска, английска и румънска.

6.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

6.2.1.Взаимовръзка 24.

Взаимовръзка 24. Взаимосвързаност между изработването на информационен филм [REDACTED], и качественото изпълнение по тиражирането на продукта [REDACTED]

Предвидените под-дейности и мерки по изпълнението на [REDACTED] са от важно значение за последващите дейности по тиражирането на информационния филм, описани в [REDACTED] и гарантират минимизирането на възможните грешки при произвеждането на цялото количество дискове.

6.2.2.Взаимовръзка 25.

Взаимовръзка 25. Взаимообвързаност между извършваните дейности по подготовка и изработване на информационен филм и извършваните дейности по изработване на уеб-сайт по [REDACTED].

Одобрените мастер копия на трите езикови версии на изработения информационен филм [REDACTED] ще бъдат използвани за качване в интернет страницата, разработвана по под - [REDACTED]

6.2.3.Взаимовръзка 26.

Взаимовръзка 26. Взаимообвързаност между дейностите по изработването на информационен филм и популяризирането и рекламирането на всички промоционални материали.

При изработването на информационния филм ще бъде подготвен специален модул [REDACTED], представящо всички изработени в рамката на поръчката материали.

6.2.4.Взаимовръзка 27.

Взаимовръзка 27. Взаимообвързаност между дейностите по подготовка за изработване на филм - препродукция [REDACTED] и дейностите по разработване на сценарий [REDACTED]

При изработването на сценария за информационния филм се взема предвид информацията, която е синтезирана и организирана в дейностите, предхождащи изработването на филма - препродукция.



6.2.5. Взаимовръзка 28.

Взаимовръзка 28. Взаимообвързаност между дейността по разработване на сценарий [REDACTED] и дейностите по разработване на [REDACTED]

Дейността по разработване на сценарий е основополагаща и разработването на [REDACTED]. Сценарият ще определя какви точно визуални елементи ще залегнат в основата на филма - т.е. какви кадри ще бъдат заснети. Така определените в сценария кадри се разработват и визуализират при изработката на [REDACTED] и влизат в [REDACTED].

6.2.6. Взаимовръзка 29.

Взаимовръзка 29. Взаимообвързаност между дейностите по Творческо-техническо планиране на филм [REDACTED], дейностите по Логистично-административно планиране на филм [REDACTED] и дейностите по заснемането на филм [REDACTED]

В обхвата на дейностите по Творческо-техническото планиране на филма и Логистично-административното планиране на филм се включват дейности, които са определящи за протичането на дейностите по заснемането, а именно - определяне на конкретните локации, които ще бъдат заснемани, определяне и набиране на техническото оборудване, определяне на начина на снимане, определяне на участниците и др.

6.2.7. Взаимовръзка 30.

Взаимовръзка 30. Взаимообвързаност между дейностите по Творческо-техническо планиране на филм [REDACTED], дейностите по Логистично-административно планиране на филм [REDACTED] и дейностите по изработка на необходимите за филма аудио материали [REDACTED]

В обхвата на дейностите по Творческо-техническо планиране и дейностите по Логистично-административно планиране се включват дейности, които предхождат и обуславят дейностите по изработка на необходимите за филма аудио материали, а именно: [REDACTED]

6.2.8. Взаимовръзка 31.

Взаимовръзка 31. Взаимообвързаност между дейностите по изработване на сценарий за монтаж [REDACTED], действията по изработка на необходимите за филма аудио материали [REDACTED] и действията по постпродукция [REDACTED]



Изработката на сценария за монтаж е основополагащ за осъществяване на [REDACTED]. С него се определят както броят на кадрите и тяхната продължителност, така и финалният текст за дикторския глас на български език. Резултат от дейностите по изработка на сценарий за монтаж се одобрява и финален текст за дикторски глас на английски и румънски език, които се използват за създаването на аудио материалите по [REDACTED], които от своя страна се монтират при дейностите по постпродукция в [REDACTED].

Дейност 7. [REDACTED]

7.1. Предложение за изпълнение на дейност 7.

7.1.1. Под-дейност 7.1. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 7.1.

В тази под-дейност въз основа на селектирана информация по [REDACTED] и съобразно насоките, дадени от концепцията, създадена в [REDACTED] ще бъдат изготвени и обработени текстовете, които ще бъдат включени в информационния каталог. Те ще бъдат съобразени с цялостната линия на комуникация в информационните материали и ще бъдат поднесени в различни информационни формати. Текстовете ще бъдат структурирани и информативни, използващи език, близък до езика на целевата аудитория. Предоставеният снимков материал ще бъде селектиран и професионално обработен, като към него ще се добавят допълнителни [REDACTED] с цел постигане на атрактивно и допълващо текста визуално възприятие, достигащо до разнообразни аудитории. Всички снимки ще бъдат висококачествени и специално обработени с цел постигане на отлично качество на крайния продукт. Избраният илюстративен материал ще бъде разнообразен [REDACTED]

[REDACTED] до графични илюстрации, съобразени не само с тематичната информация, но и професионално приложени спрямо общата стилистика.

Картите, които ще бъдат използвани в каталога ще бъдат обработени допълнително с цел по-ясна и лесна за възприемане визия.

Всички права върху използваните текстове, снимки, карти и други материали и разработки ще бъдат гарантирани или с изрично упоменат източник на материала.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.1.

Прецизното изготвяне на текстовете и професионалната обработка на илюстративния материал е задължителен елемент в подготовката на информационния каталог. Текстовете следва да бъдат редактирани в различни формати и в посока на постигане на по-близък до потребителите език, който ще ги направи по-интересни и забавни за тях, но същевременно ще запази тяхната информативна стойност и полезност. Кадрите следва да бъдат



обработени в посока постигане на по-ярка и въздействаща визия. Използването на разнообразен илюстративен материал ще създаде продукт, който ще привлече и задържи вниманието на потребителите.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.1.

Подготвено текстово съдържание и професионално обработен и избран илюстративен материал за информационен каталог.

7.1.2. Под-дейност 7.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.2.

Изпълнението на тази под-дейност е свързано с изработването на цялостен и консистентен художествено-графичен проект за информационния каталог, съответстващ на изготвената концепция. В основата на художествено-графичния проект ще залегне използването на съвременни и въздействащи графични елементи, които да са лесни за възприемане от целевите групи. Художествено-графичният проект ще бъде отличителен и ще кореспондира с останалите създадени по проекта материали.

Графичният проект ще бъде с ясна композиция, осигуряваща добър баланс между текстова информация, картон и илюстративен материал. Дизайнът ще бъде специално изработен, съобразен с визуалната идентичност на проекта и в съответствие с изискванията за информация и публичност на Програма Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. Съдържанието ще бъде оформено по начин, спомагащ за бързата ориентация на потребителя. С цел по-добро възприемане ще бъдат използвани ярки и въздействащи кадри. При графичното оформление ще се следва единен стил и обща стилистика, както и ще бъдат използвани единни шрифтове и логотипи.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.2.

Създаването на цялостен и консистентен художествено-графичен дизайн на информационния каталог е ключов за начина на възприемане на крайния продукт от целевата аудитория. Балансираното използване на традиционни и съвременни графични похвати при графичното оформление ще подпомогнат лесната ориентация на потребителя в съдържанието и поднасянето на информацията по атрактивен и визуално въздействащ начин.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.2.

Цялостен художествено-графичен проект за информационен каталог

7.1.3. Под-дейност 7.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.3. (надграждаща)

Създаденият цялостен художествено - графичен проект за информационен каталог на български език ще бъде подложен на обсъждане и корекции с Възложителя. На база обратната връзка от страна на Възложителя ще бъдат нанесени съответните корекции и върнати за допълнително обсъждане и отразяване в художествено-графичния проект.



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.3.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Обсъждането с Възложителя в този етап е задължителен елемент за качествено изпълнение на дейностите в него. Създаването на електронен вариант на каталога ще позволи на Възложителя да изрази своето виждане и нанесе своите корекции навременно.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.3.

Одобрен от Възложителя художествено-графичен проект на информационния каталог на български език.

7.1.4.Под-дейност 7.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.4. (надграждаща)

След потвърждение от стана на Възложителя, цялото съдържание на информационния каталог ще бъде организирано в един електронен файл, който ще бъде предоставен на коректор за финални стилистични, пунктуационни граматически корекции.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.4.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Ключов момент при тази под-дейност е преминаването на целия текст на информационния каталог през коректура, която ще позволи навременно отстраняване на допуснати стилистични, пунктуационни граматически грешки.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.4.

Финален коригиран вариант на информационния каталог.

7.1.5.Под-дейност 7.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.5.

Финално коригираният електронен вариант на информационния каталог се генерира в електронен формат PDF и изпратен на Възложителя за одобрение. След консултации аргументираните забележки ще бъдат отстранени и електронния вариант на каталога финализиран.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.5.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Тази под-дейност ще позволи използването на така генерирания и одобрен финален PDF формат в интернет



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



страницата по дейност 5, както и ще е изходен материал за генерирането на предпечатен файл на информационния каталог.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.5.

Финален електронен PDF вариант на информационния каталог на български език, готов за използване в уеб-сайта, разработван по дейн. 5.

7.1.6.Под-дейност 7.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.6.

Финално коригираният електронен PDF вариант на информационният каталог се подава към лицензирани преводачи за превод съответно на английски и румънски език.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.6.

Преводът на информационния каталог на английски и румънски език е ключов етап за създаването на езиковите версии на информационния каталог.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.6.

Преведени текстове на електронния вариант на информационния каталог на английски и румънски.

7.1.7.Под-дейност 7.7.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.7.

Преведени варианти на информационния каталог на английски и румънски език следва да бъдат цялостно прегледани и графично коригирани предвид различната структура на текстовете поради езиковите особености на всеки от вариантите.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.7.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Графичното оформление на версиите на румънски и английски език има за цел съобразяване на графичния вид на каталога със структурата на текстовете на съответните езици за постигане на отличен графичен продукт. Генерираните файлове ще бъдат изпратени на Възложителя за коментари и одобрение. След одобрение, същите ще бъдат използвани за качване в интернет страницата, разработвана по дейност 5.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.7.

Изработени и одобрени електронни PDF варианти на информационния каталог на английски и румънски език, готови за използване в уеб-сайта, разработван по дейност 5.



7.1.8.Под-дейност 7.8.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.8.

Въз основа на генерираните PDF формати на каталога ще бъдат подготвени предпечатните файлове на информационния каталог на български, английски и румънски език. Файловете ще бъдат консултирани с Възложителя.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.8.

Създаването на предпечатните файлове на различните езикови версии е ключова под-дейност, която е от важно значение за последващите под-дейности по отпечатване на информационния каталог, описани в дейност 10.6.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.8.

Одобрен предпечатен файл на информационния каталог на български, английски и румънски език.

7.1.9.Под-дейност 7.9.

Действия по изпълнение на под-дейност 7.9. (надграждаща)

Въз основа на изработените предпечатни файлове се отпечатват макети на информационния каталог в различните езикови версии за финално одобрение от Възложителя преди производството на цялото предвидено от Възложителя количество.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 7.9.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Създаването и одобрението на макет е важна под-дейност, която цели минимизиране на възможните грешки в отпечатването на различните версии на информационния каталог.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 7.9.

Одобрени и отпечатани макети на информационния каталог в различни езикови версии - версия на български, английски и румънски език.

7.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

7.2.1.Взаимовръзка 32.

Взаимовръзка 32: Взаимосвързаност между изработването на информационен каталог [REDACTED], и качествено изпълнение по отпечатването на продукта [REDACTED]

Предвидените под-дейности и мерки по изпълнението на дейност 7 са от важно значение за последващите дейности по отпечатване на информационния каталог, описани в под-дейност 12.2. и гарантират минимизирането на възможните грешки в отпечатването на информационния каталог.



[Handwritten signature]

7.2.2. Взаимовръзка 33.

[Handwritten signature]

Взаимовръзка 33: Взаимообвързаност между извършваните дейности по подготовка и изработване на информационен каталог и очакванията на Възложителя, подробно разписани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата поръчка.

Качественото изпълнение на предвидените под-дейности в дейност 7 и мерките, предприети за обсъждане с Възложителя на всеки резултат от подготовката и изработването на информационния каталог гарантират създаването на качествен продукт, отговарящ и надхвърлящ всички очаквания на Възложителя и успешното му възприемане от целевата аудитория

7.2.3. Взаимовръзка 34.

Взаимовръзка 34: Взаимообвързаност между извършваните дейности по подготовка и изработване на информационен каталог и извършваните дейности по изработване на уеб-сайт по дейност 5.

Генерираните и одобрени електронни файлове в PDF формат на трите езикови версии на изработения информационен каталог [REDACTED] ще бъдат използвани за качване в интернет страницата, разработвана по дейност 5.

7.2.4. Взаимовръзка 35.

Взаимовръзка 35: Взаимообвързаност между дейностите по изработването на информационен каталог и популяризирането и рекламирането на всички промоционални материали.


При изработването на информационния каталог ще бъде разработени специални рекламно-информационни формати, представящи и промотиращи всички изработени в рамката на поръчката материали.

7.2.5. Взаимовръзка 36.

Взаимовръзка 36: Взаимосвързаност между изготвяне на текстове и обработка на снимков и др. материал за информационния каталог [REDACTED], и качественото изпълнение на дейностите по изработване на художествено - графичен проект на информационен каталог [REDACTED]

Подготвеното текстово съдържание и професионално обработеният и подбран илюстративен материал като резултат от [REDACTED] са в основата на качественото изпълнение на дейностите по изработване на художествено-графичен проект за информационния каталог. Подготвеното съдържание и снимков материал и техният обем са изходна точка за художественото и графичното оформление на информационния каталог.

[Handwritten signature]



7.2.6. Взаимовръзка 37.

Взаимовръзка 37: Взаимосвързаност между предпечатна подготовка на информационния каталог на български, английски и румънски език и качествено отпечатване на информационен каталог

Създадените предпечатни файлове в рамките на са основополагащи за стартирането на дейностите по отпечатване на информационния каталог, включени в . Без изготвянето на качествени предпечатни файлове не може да се започнат действията по отпечатване на информационния каталог.

Дейност 8.

8.1. Предложение за изпълнение на дейност 8.

8.1.1. Под-дейност 8.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.1.

Въз основа на концепцията за създаване на брошура по , както и при вземане под внимание на селектираната полезна информация по , ще бъдат изготвени текстове, които ще бъдат включени в съдържанието на брошурата. Поради спецификата на параметрите на информационния материал, текстовете на брошурата ще се отличават с висока концентрираност и богата информационна наситеност. Текстовете ще бъдат ясни и целенасочени и ще използват език, близък и лесен за възприемане от целевите групи.

Предоставеният снимков материал ще бъде селектиран в съответствие с концепцията за изработка на брошурата, като поради спецификата на формата ще се наблегне върху силно въздействащи кадри, които ще бъдат обработени професионално. Ще бъдат добавени допълнителни за атрактивност на визуалния контент. Всички снимки, които ще бъдат включени, ще бъдат висококачествени и обработени с цел постигане на отлично качество на крайния продукт. Фотографските кадри ще бъдат професионално подбрани спрямо общата стилистика и в съответствие с търсените внушения на крайния продукт.

Използването на карти за представянето на туристическия продукт ще допринесе за лесната ориентация на аудиторията. Всички карти ще бъдат обработени специално за целите на брошурата, като се вземе предвид спецификата на информационния материал, ще бъдат използвани карти в подходящ за брошурата мащаб.

Всички права върху използваните текстове, снимки, карти и други материали и разработки ще бъдат гарантирани или с изрично упоменат източник на материала.



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.1.

Целенасоченото и професионално изготвяне на текстовете и специализираната обработка на включения снимков материал и карти е ключова за подготовката на брошурата. Текстовият материал ще бъде синтезиран и редактиран в съответствие с характеристиките и параметрите на брошурата и необходимостта от концентрираност и висока информативност на текстовете, като същевременно се следва линията за запазване на език, близък до този на крайните потребители. Използваните кадри ще бъдат силно въздействащи, отличаващи се с висока информативност и разпознаваемост на заснетите обекти.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.1.

Подготвено текстово съдържание и професионално обработен и подбран илюстративен материал.

8.1.2.Под-дейност 8.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.2.

При тази под-дейност ще бъде изработен единен художествено - графичен проект за брошурата, който съответства на изготвената и одобрена концепция за брошурата (от своя страна базирана на концепцията за информационния каталог). Художествено-графичният проект за брошурата ще следва няколко основни принципа:

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.2.

Единният вид на художествено-графичния проект на брошурата е изключително важен за въздействието му върху крайните потребители. Визията трябва да се отличава с балансираност и композиционна цялост, които да стоят в основата на лесната ориентация на целевата аудитория в съдържанието на брошурата.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.2.

Изработен цялостен художествено-графичен проект за информационен каталог

8.1.3.Под-дейност 8.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.3. (надграждаща)

Художествено - графичният проект за брошурата на български език ще бъде предоставен за коментари и корекции от страна на Възложителя. Така



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



подадените от негова страна корекции и коментари ще бъдат отразени от екипа и върнати към Възложителя отново за одобрение.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.3.

Обсъждането с Възложителя е изключително важно за постигане на висококачествен продукт.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.3.

Одобрен от Възложителя художествено-графичен проект на брошурата на български език.

8.1.4.Под-дейност 8.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.4. (надграждаща)

При получаване на крайния резултат от под-дейност 8.3. - а именно одобрен от Възложителя художествено-графичен проект на брошурата на български език, той ще бъде предоставен за професионална коректура за стилистични, пунктуационни граматически грешки.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.4.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Отстраняването на стилистични, пунктуационни граматически грешки и неточности в тази под-дейност е изключително важно за получаването на качествен краен продукт.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.4.

Финален коригиран вариант на брошурата на български език.

8.1.5.Под-дейност 8.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.5. (надграждаща)

Финално коригираният електронен вариант на брошурата на български език се генерира в електронен формат PDF и се изпраща на Възложителя за одобрение. След консултации аргументираните забележки ще бъдат отстранени и електронният вариант на брошурата ще бъде финализиран.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.5.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Генерираният PDF формат на брошурата ще позволи качването на електронен вариант на брошурата на интернет страницата по дейност 5. и ще бъде използван за генерирането на предпечатен файл на брошурата.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.5.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



Финален одобрен електронен PDF вариант на брошурата на български език, готов за използване в уеб-сайта, разработван по дейност 5.

8.1.6.Под-дейност 8.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.6.

Финално коригираният електронен PDF вариант на брошурата ще бъде предоставен за превод на лицензирани преводачи на английски и румънски език.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.6.

Преводът на брошурата на английски и румънски език е в основата на създаването на езиковите версии на брошурата.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.6.

Преведени текстове на електронния вариант на брошурата на английски и румънски език.

8.1.7.Под-дейност 8.7.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.7. (надграждаща)

Преведени варианти на брошурата на английски и румънски език ще бъдат цялостно прегледани и графично коригирани предвид различната структура на текстовете на конкретните езици.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.7.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлияе положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Графичното оформление на версиите на румънски и английски език има за цел съобразяване на графичния вид на брошурата със структурата на текстовете на съответните езици за постигане на завършен висококачествен продукт. Така оформените версии на брошурата на английски и румънски език ще бъдат изпратени на Възложителя за коментари, мнение и след отразяване на коментарите - за финално одобрение. След одобрение, същите ще бъдат използвани за качване в интернет страницата, разработвана по дейност

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.7.

Финално одобрени от Възложителя PDF варианти на информационния каталог на английски и румънски език, готови за използване в интернет страницата, разработвана по дейност 5.

8.1.8.Под-дейност 8.8.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.8.



Въз основа на генерираните PDF формати на брошурата ще бъдат подготвени предпечатните файлове на брошурата на български, английски и румънски език. Тези файлове ще се предоставят за крайно одобрение от Възложителя. **Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.8.**

Създаването на предпечатните файлове на различните езикови версии е ключова под-дейност, която е от важно значение за последващите под-дейности по отпечатване на брошурата, описани в под-дейност 12.5.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.8.

Одобрени предпечатни файлове на брошурата на български, английски и румънски език.

8.1.9.Под-дейност 8.9.

Действия по изпълнение на под-дейност 8.9. (надграждаща)

На базата на изработените предпечатни файлове се отпечатват макети на брошурата в различните езикови версии за финално одобрение от Възложителя преди производството на цялото предвидено от Възложителя количество.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 8.9.

Предложеният резултат от тази дейност не е част от изискванията на Техническата спецификация, но ще повлия положително на качествено изпълнение на предмета на поръчката. Създаването и одобрението на макет е важна под-дейност, която цели минимизиране на възможните грешки в отпечатването на различните версии на брошурата.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 8.9.

Одобрени и отпечатани макети на брошурата в различни езикови версии - версии на български, английски и румънски език.

8.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

8.2.1.Взаимовръзка 38.

Взаимовръзка 38. Взаимосвързаност между изработването на брошура [REDACTED] и качествено изпълнение по отпечатването на продукта

Предвидените под-дейности и мерки по изпълнението на [REDACTED] са от важно значение за последващите дейности по отпечатване на брошурата, описани в [REDACTED] и гарантират минимизирането на възможните грешки в отпечатването на продукта.

8.2.2.Взаимовръзка 39.

Взаимовръзка 39. Взаимообвързаност между извършваните дейности по подготовка и изработване на брошура и очакванията на Възложителя,



подробно разписани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата поръчка.

Качественото изпълнение на предвидените под-дейности в [REDACTED] и мерките, предприети за обсъждане с Възложителя на всеки резултат от подготовката и изработването на брошура гарантират създаването на качествен продукт, отговарящ и надхвърлящ всички очаквания на Възложителя и успешното му възприемане от целевата аудитория.

8.2.3. Взаимовръзка 40.

Взаимовръзка 40. Взаимообвързаност между извършваните дейности по подготовка и изработване на брошура и извършваните дейности по изработване на уеб-сайт по дейност 5.

Генерираните и одобрени електронни файлове в PDF формат на трите езикови версии на изработената брошура [REDACTED] ще бъдат използвани за качване в интернет страницата, разработвана по дейност 5.

8.2.4. Взаимовръзка 41.

Взаимовръзка 41. Взаимообвързаност между дейностите по изработването на брошурата и популяризирането и рекламирането на всички промоционални материали.

При изработването на брошурата ще бъдат разработени специални рекламno-информационни формати, представящи и промотиращи всички изработени в рамката на поръчката материали.

8.2.5. Взаимовръзка 42.

Взаимовръзка 42. Взаимосвързаност между изготвяне на текстове и обработка на снимков и др. материал за брошура [REDACTED], и качественото изпълнение на дейностите по изработване на художествено - графичен проект на брошура [REDACTED]

Подготвеното текстово съдържание и професионално обработеният и подбран илюстративен материал като резултат от [REDACTED] са в основата на качественото изпълнение на дейностите по изработване на художествено-графичен проект за брошурата. Подготвеното съдържание и снимков материал и техният обем са изходна точка за художественото и графичното оформление на брошурата.

8.2.6. Взаимовръзка 43.

Взаимовръзка 43. Взаимосвързаност между предпечатна подготовка на брошурата на български, английски и румънски език [REDACTED] и качественото отпечатване на брошура [REDACTED]. Създадените предпечатни файлове в рамките на [REDACTED] са основополагащи за стартирането на дейностите по отпечатване на брошурата, включени в [REDACTED]. Без изготвянето на качествени предпечатни файлове не може да се започнат действията по отпечатване на брошурата.



Дейност 9.

9.1.Предложение за изпълнение на дейност 9.

9.1.1.Под-дейност 9.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 9.1.

При провеждането на срещата и извършване на демонстрацията пред Възложителя се описват всички възникнали корекции и желани доработки, като се аргументират и залагат в общия план на работата на Участника. На работна среща участникът ще предостави на Възложителя решение в което ще може лесно да бъдат описани и проследени всички корекции възникнали при демонстрацията, породени по различни причина - технологични или визуални, информационни или технически корекции.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.1.

Важен елемент от ефективното изпълнение на проекта е комуникацията и редовни консултации с Възложителя, както и провеждането на работна среща за демонстрация на изработеното мобилно приложение, интерактивната игра и уебсайта. Постигането на успешни резултати при изпълнение на дейностите се гарантира от правилното използване на методологията и инструментариума на управление на проекта, а една от основните дейности е именно събирането на обратна връзка от Възложителя.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.1.

Протокол със становището на Възложителя за разработените мобилни приложения

9.1.2.Под-дейност 9.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 9.2.

След провеждането на срещата с Възложителя участникът ще извърши всички необходими коригиращи действия и доработки, за да се финализират мобилните приложения, след което може да се премине към внедряване и пускане на приложението в реална среда.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.2.

Направените корекции ще усъвършенстват изработения първоначален продукт на база аргументираните корекции и изпълнените корективни действия и доработки от страна на Участника.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.2.

Усъвършенстван продукт, отговарящ на очакванията на Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



9.1.3.Под-дейност 9.3. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 9.3.

Участникът извършва всички необходими коригиращи действия и доработки, за да се финализира разработването на [REDACTED], след което може да се премине към внедряване и в мобилното приложение. В предложението си, Участникът е заложил процес на тестове, описване на корекции и изпълнение на коригиращите действия, за да бъдат покрити всички аргументирани изисквания на Възложителя.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.3.

Направените корекции ще усъвършенстват изработения първоначален продукт на база аргументираните корекции и изпълнените корективни действия и доработки от страна на Участника.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.3.

Усъвършенстван краен резултат - [REDACTED]

9.1.4.Под-дейност 9.4. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 9.4.

Участникът извършва всички необходими коригиращи действия и доработки, за да се финализира разработването на уебсайта. В предложението си, Участникът е заложил процес на тестове, описване на корекции и изпълнение на коригиращите действия, за да бъдат покрити всички аргументирани изисквания на Възложителя.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.4.

Направените корекции ще усъвършенстват изработения първоначален продукт на база аргументираните корекции и изпълнените корективни действия и доработки от страна на Участника.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.4.

Усъвършенстван краен резултат - уебсайт

9.1.5.Под-дейност 9.5. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 9.5.

По време на целия процес на изработване на информационния филм - от създаването на концепцията до тиражирането му на DVD дискове, са предвидени редица мерки, гарантиращи своевременното отразяване на аргументирани коментари и забележки от страна на Възложителя, така че те да бъдат отразени своевременно, безпроблемно и без нарушаване, прекъсване или забавяне на процесите по изпълнението на дейността.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО


ROMANIA - BULGARIA



Interreg



Действията включват конкретни стъпки и механизми за навременно отстраняване на коментари и забележки при процедурите за одобрение на:



Приключването на всички етапи ще бъде удостоверено с подписан двустранен протокол за одобрение за тиражиране на информационния филм.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.5.

Консултирането и своевременното нанасяне на корекции от страна на Възложителя във всеки етап от изработването на информационния филм е от изключителна важност за минимизирането на възможните грешки и забавянето на процеса на изработване на продукта и е гаранция за постигането на качествен завършен продукт, надхвърлящ базовите изисквания на Техническата спецификация и очакванията на Възложителя.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.5.


Протокол за одобрение за тиражиране на цялото предвидено от Възложителя количество на информационния филм.

9.1.6. Под-дейност 9.6.

Действия по изпълнение на под-дейност 9.6.

По време на целият процес на изработване на информационния каталог - от създаването на концепцията до отпечатването на макети в различни езикови версии, са предвидени редица мерки, гарантиращи своевременното отразяване на аргументирани коментари и забележки от страна на Възложителя, така че те да бъдат отразени своевременно, безпроблемно и без нарушаване, прекъсване или забавяне на процесите по изпълнението на дейността.

Действията включват конкретни стъпки и механизми за навременно отстраняване на коментари и забележки при процедурите за одобрение на:





[Handwritten signature]

Приключването на етапите ще бъде удостоверено с подписан двустранен протокол за одобрение за производство на информационния каталог.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.6.

Консултирането и своевременното нанасяне на корекции от страна на Възложителя във всеки етап от изработването на информационния каталог е от изключителна важност за минимизирането на възможните грешки и забавянето на процеса на отпечатването на информационния каталог и е гаранция за постигането на качествен завършен продукт, надхвърлящ базовите изисквания на Техническата спецификация и очакванията на Възложителя.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.6.

Протокол за одобрение за производство на цялото предвидено от Възложителя количество (тираж) на информационен каталог.

9.1.7.Под-дейност 9.7.

Действия по изпълнение на под-дейност 9.7.

По време на целият процес на изработване на брошурата - от създаването на концепцията до отпечатването на макети в различни езикови версии, са предвидени редица мерки, гарантиращи своевременното нанасяне на коментари и забележки от страна на Възложителя, така че те да бъдат отразени своевременно, безпроблемно и без нарушаване, прекъсване или забавяне на процесите по изпълнението на дейността.

Действията включват конкретни стъпки и механизми за навременно отстраняване на коментари и забележки при процедурите за одобрение на:

Приключването на етапите ще бъде удостоверено с подписан двустранен протокол за одобрение за производство на информационния каталог.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 9.7.

Консултирането и своевременното нанасяне на корекции от страна на Възложителя във всеки етап от изработването на брошурата е от изключителна важност за минимизирането на възможните грешки и забавянето на процеса на отпечатването на продукта и е гаранция за постигането на качествен завършен

[Handwritten signature]



продукт, надхвърлящ базовите изисквания на Техническата спецификация и очакванията на Възложителя.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 9.7.

Протокол за одобрение за производство на цялото предвидено от Възложителя количество (тираж) на брошура.

9.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

9.2.1.Взаимовръзка 44.

Взаимовръзка 44: Взаимообвързаност между провеждането на работна среща с Възложителя за демонстрация на разработеното приложение и извършването на необходимите корекции и доработки за мобилното приложение за смартфон, игра и уебсайт

Важен процес за успеха на мобилното приложение е демонстрацията пред Възложителя [REDACTED]. За целите на представянето ще бъдат демонстрирани цялата функционалност, елементи на графичната концепция от гледна точка на потребителите, възможностите и покритите изисквания заложи в концепцията на мобилното приложение, интерактивната игра и уебсайта.

При поява на необходими доработки или аргументирани изисквания, при проведената демонстрация, Участникът ще извърши корекциите на мобилното приложение [REDACTED], [REDACTED], уебсайта [REDACTED]. Това ще гарантира изпълняването на поставените изисквания от страна на Възложителя.

9.2.2.Взаимовръзка 45.

Взаимовръзка 45: Взаимообвързаност между получените аргументирани коментари и забележки от страна на Възложителя по филма, информационния каталог брошурата и извършването на корективни действия от страна на Изпълнителя

Предпоставка за постигане на качествен резултат в рамките на поръчката - филм, информационен каталог и брошура е в пряка зависимост от осъществяването на ефективно взаимодействие с Възложителя. Връзката между аргументираните забележки от страна на Възложителя се осъществява чрез предприемане на действия от страна на Изпълнителя в [REDACTED], за отразяване на обоснованите забележки, което води до постигане на пълна удовлетвореност на Възложителя и представяне на качествен продукт за целите на промотирането на новия съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Дейност 10. [REDACTED]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



10.1. Предложение за изпълнение на дейност 10.

10.1.1. Под-дейност 10.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 10.1.

Публикуване на одобрените мобилни приложения в реална среда, предоставяна на всички сорс кодове и документи на Възложителя.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 10.1.

Резултат от изпълнението е проектирането и създаването на едно успешно мобилно приложение, което да бъде внедрено в реално среда и достигайки до всички потребители.

Мобилното приложение следва да бъде достъпно за всички потребители ползващи устройства с най-разпространените операционни системи (Android, iOS, Microsoft, Blackberry), като визуално ще бъде съобразено със зададените в предишните под-дейности графична концепция и технологична конструкция.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 10.1.

Внедрени мобилните приложения, предоставени документи и свързани с разработката кодове.

10.1.2. Под-дейност 10.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 10.2.

Като резултат ще направим оценка и на всички възникнали проблеми, рискове, които са наложили промени в процеса на работата, с което продуктът следва да е по-добър и актуален на пазара.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 10.2.

В тази дейност ще бъде изцяло валидирано и оценено направеното до момента - създаваме отделна методология за оценка, като преминаваме през множество ключови моменти и сравнителни действие по първоначалните оценка и планове.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 10.2.

Валидация и цялостна оценка на изработените мобилни приложения

10.1.3. Под-дейност 10.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 10.3.

След преминаване на основните стъпки при отстраняване на забележки във връзка с разработването на мобилното приложение, Участникът ще предостави на Възложителя сорс кодовете на приложението, пароли за достъп, сертификати издадени за разработката на мобилните приложения и всички допълнително поискани данни.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA

Interreg



При предоставянето на всички данни, Участникът предоставя и информационни технически ръководства, описващи основните технологични решения внедрени в мобилните приложения.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 10.3.

Неизменна част от процеса по публикуване в порталите, прехвърлянето на правата върху сорс кода и компилирания код, които са неизменна част от този проекта, Участникът подготвя и детайлно описания и техническо ръководство за мобилните приложения, за да може Възложителя да разполага с цялата информация и след приключване на дейностите по текущата поръчка.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 10.3.

Разработено приложение за смартфон/ друго преносимо устройство, вкл. интерактивна игра

10.1.4.Под-дейност 10.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 10.4.

След преминаване на основните стъпки при отстраняване на забележки във връзка с разработването на уебсайта, Участникът ще предостави на Възложителя сорс кодовете на уебсайта, използваните материали, като графики, снимки, документи и други, пароли за достъп, сертификати издадени при разработката на уебсайта и всички допълнително поискани данни от страна на Възложителя. При предоставянето на уебсайта, Участникът ще предостави авторските права над разработения продукт, като ще окаже и пълно съдействие при прехвърлянето на сайта върху техниката на Възложителя, като в допълнение ще изработи техническа документация и ръководство за инсталиране и настройване на уебсайта върху сървъри/техника на Възложителя.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 10.4.

Участникът предоставя цялата необходима информация свързана с разработването на уебсайта - в това число сорс кодове и използвани материали, за да може Възложителят да разполага с нея и след приключване на дейностите по текущата поръчка и да бъде инсталиран върху техника на Възложителя. Участникът прехвърля и авторските права след приключване на разработката, като част от договора към текущата поръчка.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 10.4.

Документация за инсталиране и настройка, Уебсайт на проекта

10.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

10.2.1.Взаимовръзка 46.

Взаимовръзка 46: Взаимообвързаност между извършваните услуги по подготовка, разработване и предоставяне на приложение за смартфон/ друго преносимо устройство, [REDACTED] и уебсайт и очакванията на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



Възложителя, подробно разписани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата поръчка

Като част от планирането на работата, както и в предходно описаните взаимовръзки между техническите спецификации, разработената и внедрена концепция за мобилните приложения, вкл. уебсайта и изпълнението по разработка, ще покаже ясно изразените и внедрени подробно разписани в техническите спецификации изисквания и очаквания на Възложителя.

Възложителя ще има възможност да проследява целия процес на работа, като поетапно ще преминава през процеса на разработка и внедряване на мобилните приложения.

Дейност 11.

11.1.Предложение за изпълнение на дейност 11.

11.1.1.Под-дейност 11.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 11.1. (надграждаща)

Въз основа на създадените и одобрени мастер копия на информационния филм в три езикови версии - българска, английска и румънска, преди пристъпване към тиражирането им, всяка езикова версия се одобрява от страна на Възложителя за тиражиране чрез Възлагателно писмо, в което се уточняват точните бройки на заявения тираж.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 11.1.

Тази под-дейност е важен етап преди преминаването към тиражиране на информационния филм. Той гарантира, че подадените за тиражиране файлове са финално съгласувани с Възложителя и произведените количества дискове ще съответстват на одобрените от Възложителя мастер копия.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 11.1.

Възлагателно писмо за тиражиране на информационния филм в заявения тираж

11.1.2.Под-дейност 11.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 11.2.

След получаване на Възлагателно писмо от страна на Възложителя одобрените мастер копия на различните езикови версии на информационния филм ще бъдат тиражирани чрез запис върху DVD носители.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 11.2.

Тиражирането на информацията чрез запис на DVD носители е важна предпоставка за разпространението на информационния филм сред целевата аудитория.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 11.2.

Записан върху DVD информационен филм в заявения тираж.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



[Handwritten signature]

11.1.3. Под-дейност 11.3. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 11.3. (надграждащи технически параметри)

Записаните в тираж от 20 000 бр. DVD дискове ще бъдат брендиращи чрез пълноцветен печат. Така брендиращите DVD дискове ще бъдат вложени и окомплектовани поединично в пластмасови кутии с пълноцветно отпечатани вложки (корица и гръб) на кутията (надграждащ параметър), както и фолирани поединично (надграждащ параметър).

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 11.3.

Техническите характеристики по изпълнението на тази дейност надграждат и превъзхождат изискванията на Техническата спецификация. Брендирането на дисковете ще позволи включване на допълнителни визуални елементи към крайния продукт, кореспондиращи с цялостната концепция за създадените по проекта информационни материали, което от своя страна ще способства за високата разпознаваемост на продукта и постигане на общ брендинг. Брендирането ще следва стриктно правилата за публичност и информация на Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 11.3.

Брендиращи и вложени в пластмасови кутии с пълноцветни вложки DVD дискове, фолирани по единично в заявения тираж.

11.1.4. Под-дейност 11.4. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 11.4.

Тиражиращите DVD дискове ще бъдат доставени подходящо пакетирани, като начинът им на опаковане ще гарантира транспортирането им без рискове за увреждане. Всички дискове ще бъдат фолирани поотделно и окомплектовани в определени количества в кашони с етикети, описващи вида на материала и количеството във всеки кашон. Доставените дискове ще бъдат приети от Възложителя с подписан двустранен приемо-предавателен протокол.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 11.4.

Доставката на дисковете във вид, който гарантира съхранението им без риск от увреждането им, е предпоставка за запазването на целостта и качеството на материалите. Подходящото опаковане и поставянето на етикети с описание на количеството и вида материал ще помогне за по-бързата ориентация на Възложителя при използване на материалите.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 11.4.

Доставени и приети от страна на Възложителя брендиращи и опаковани DVD дискове в заявения тираж.

[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Handwritten signature

11.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

11.2.1. Взаимовръзка 47.

Handwritten signature

Взаимовръзка 47. Взаимообвързаност между извършваните дейности по подготовка и изработване на информационен филм и очакванията на Възложителя, подробно разписани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата поръчка.

Качественото изпълнение на предвидените под-дейности в дейност 9 и мерките, предприети за обсъждане с Възложителя на всеки резултат от подготовката и изработването на информационния филм гарантират създаването на качествен продукт, отговарящ и надхвърлящ всички очаквания на Възложителя и успешното му възприемане от целевата аудитория.

Дейност 12.

12.1. Предложение за изпълнение на дейност 12.

12.1.1. Под-дейност 12.1.

Действия по изпълнение на под-дейност 12.1. (надграждаща)

Въз основа на създадените и одобрени предпечатни файлове за каталога по [REDACTED] и одобрените разпечатки на информационните каталози във всяка езикова версия по [REDACTED], в съответствие с подписаните протоколи по [REDACTED], от Възложителя се преминава към отпечатване на информационните каталози на база на подписани от Възложителя Възлагателни писма, в които се уточняват точните бройки на заявения тираж.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 12.1.

Тази под-дейност е важен етап преди преминаването към отпечатване на информационните каталози. Той гарантира, че подадените за печат файлове са финално съгласувани с Възложителя и отпечатаните информационни каталози ще съответстват на одобрените от Възложителя разпечатки.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 12.1.

Възлагателно писмо за отпечатване на заявения тираж на информационните каталози съответно на български, английски и румънски език.

12.1.2. Под-дейност 12.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 12.2.

Въз основа Възлагателното писмо се стартира отпечатването на информационния каталог. Изработката ще следва високотехнологични и съвременни методи на отпечатване на печатни материали, което ще гарантира високото качество на крайния продукт. Информационният каталог ще бъде

Handwritten signature



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA

Interreg



отпечатан в 3 езикови версии - българска, английска и румънска езикова версия при следните количества на общия тираж: информационен каталог на български език - 5000 бр., информационен каталог на английски език - 2500 бр., информационен каталог на румънски език - 2500 бр.

Всички езикови версии ще бъдат отпечатани със следните технически характеристики:

Формат: A4 (в сгънат вид)

Цветност на печат: 4+4

Хартия на корица: 350 гр. гланц (надграждащ параметър)

Хартия на тяло: 115 гр. гланц (надграждащ параметър)

Обем корица: 4 стр. (надграждащ параметър)

Обем тяло: 100 стр.

Допълнителни:

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 12.2.

Техническите характеристики по изпълнението на тази дейност обосновават надграждат и превъзхождат изискванията на Техническата спецификация. Отпечатването на висококачествен и атрактивен краен продукт е важна предпоставка за добра комуникация с крайните потребители на информационния каталог. Доброто и качествено изпълнение на тази под-дейност е в пряка връзка с първите впечатления на потребителите от цялостния туристически продукт. С предложеното подобряване на техническите характеристики на продукта ще се постигне повишаване на представителния характер на артикула (по-качествен картон за корицата, по-плътна хартия на тялото, допълнителна повърхностна обработка - ламинат и лак на корицата) и ще се повишат потребителските качества на продукта (по-голяма издръжливост и устойчивост при употреба, недопускане на прозрачност/наслаждане на изображенията на лице/гръб в тялото).

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 12.2.

Отпечатани информационни каталози на български език: 5000 бр., Отпечатани информационни каталози на английски език: 2500 бр., Отпечатани информационни каталози на румънски език: 2500 бр.

12.1.3.Под-дейност 12.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 12.3.

Информационните каталози ще бъдат доставени подходящо пакетирани, като начинът им на опаковане ще гарантира транспортирането им без рискове за увреждане на каталозите. Върху всяка опаковка ще бъде поставен етикет с надпис, съдържащ точната бройка и вида на съдържащия се в опаковката материал. Доставените каталози ще бъдат приети от Възложителя с подписан двустранен приемо-предавателен протокол.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 12.3.

Доставката на информационните каталози във вид, който гарантира съхранението им без риск от увреждането им, е предпоставка за запазването на цялостта и качеството на материалите. Подходящото опаковане и поставянето на етикети с описание на количеството и вида материал ще помогне за по-бързата ориентация на Възложителя при използване на материалите.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 12.3.

Доставени и приети от страна на Възложителя информационни каталози при следните количества: Отпечатани информационни каталози на български език: 5000 бр., Отпечатани информационни каталози на английски език: 2500 бр., Отпечатани информационни каталози на румънски език: 2500 бр.

12.1.4.Под-дейност 12.4.

Действия по изпълнение на под-дейност 12.4. (надграждаща)

Въз основа на създадените и одобрени предпечатни файлове за брошурата по [REDACTED] и одобрените разпечатки на информационните каталози във всяка езикова версия по [REDACTED] в съответствие с подписаните протоколи по [REDACTED] от Възложителя, се преминава към отпечатване на брошурата на база на подписани Възлагателни писма, в които са уточнени точните бройки на заявения тираж.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 12.4.

Тази под-дейност е важен етап преди преминаването към отпечатване на брошурата. Той гарантира, че подадените за печат файлове са финално съгласувани с Възложителя и отпечатаните брошури ще съответстват на одобрените от Възложителя разпечатки.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 12.4.

Възлагателно писмо за отпечатване на заявения тираж на брошурата съответно на български, английски и румънски език.

12.1.5.Под-дейност 12.5.

Действия по изпълнение на под-дейност 12.5.

При отпечатването на брошурата ще бъдат използвани финално одобрените от Възложителя макети на брошурата на български, английски и румънски език. Отпечатването ще бъде осъществено по начин и с използването на техническа база, която да осигури и гарантира високото качество на произведения краен продукт. Брошурата ще бъде отпечатана в общи тираж от 30 000 копия - в три езикови версии при следните количества: брошура на български език - 15 000 бр., брошура на английски език - 7500 бр., брошура на румънски език - 7500 бр.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



Всички езикови версии ще бъдат отпечатани със следните технически характеристики:

Формат: A4 (в сгънат вид)

Цветност на печат: 4+4 (пълноцветен печат)

Хартия на корица: 300 гр гланц

Хартия на тяло: 150 г гланц (надграждащ параметър)

Обем корица: 4 стр. (надграждащ параметър)

Обем тяло: 32 стр. (надграждащ параметър)

Допълнителни:

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 12.5.

Техническите характеристики по изпълнението на тази дейност обосновават надграждат и превъзхождат изискванията на Техническата спецификация. Познаването на технологичния процес и стриктното и професионалното му следване са предпоставки за постигане на висококачествен краен продукт, който от своя страна е ключов фактор при възприемането му от страна на целевата аудитория. С предложеното подобряване на техническите характеристики на продукта ще се постигне повишаване на представителния характер на артикула.

ще се повишат потребителските качества на продукта

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 12.5.

Отпечатани брошури на български език: 15 000 бр., Отпечатани брошури на английски език: 7500 бр., Отпечатани брошури на румънски език: 7500 бр.

12.1.6. Под-дейност 12.6. Доставка на брошури и опции за съхранение

Действия по изпълнение на под-дейност 12.6.

Брошурите ще бъдат доставени подходящо пакетирани, като начинът им на опаковане ще гарантира транспортирането им без рискове за увреждане на брошурата. Върху всяка опаковка ще бъде поставен етикет с надпис, съдържащ точната бройка и вида на съдържащия се в опаковката материал. Доставените брошури ще бъдат приети от Възложителя с подписан двустранен приемопредавателен протокол.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 12.6.

Доставката на информационните каталози във вид, който гарантира съхранението им без риск от увреждането им, е предпоставка за запазването на цялостта и качеството на материалите. Подходящото опаковане и поставянето на етикети с описание на количеството и вида материал ще



помогне за по-бързата ориентация на Възложителя при използване на материалите.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 12.6.

Доставени и приети от страна на Възложителя брошури при следните количества: Отпечатани брошури на български език: 15 000 бр., Отпечатани брошури на английски език: 7500 бр., Отпечатани брошури на румънски език: 7500 бр.

12.2.Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

12.2.1.Взаимовръзка 48.

Взаимовръзка 48: Взаимообвързаност между извършваните услуги по подготовка, разработване и предоставяне на печатните промоционални материали (информационен каталог и брошура) и очакванията на Възложителя, подробно разписани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата поръчка

При планиране извършването на услугата по подготовката, разработването и предоставянето на информационен каталог и брошура на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, участникът се е съобразил с посочените минимални технически характеристики в Техническата спецификация и те са послужили както за основа на предложението, така и за надграждане на изискванията на Възложителя с оглед постигане на висококачествен резултат. Предложението на Участника за изготвяне на концепция за информационен каталог [REDACTED] кореспондира с изискването на Възложителя за наличието на такава концепция и тя ще бъде съобразена с разработените, в рамките на проекта, документ

При наличие на качествени снимки, карти, текстова информация и други материали и разработки, създадени в рамките на проекта, е предвидено те да бъдат използвани при изработването на каталога и брошурата, след тяхното проучване и селектиране [REDACTED]. Участникът е предвидил вероятността от събиране на допълнителна информация, като ясно е посочил, че ще бъдат използвани снимки, карти, текстова информация или други материали, върху които притежава авторски права или ако е упоменал изрично източника на материала. [REDACTED]. Пряка връзка има между посочените от Възложителя минимални технически изисквания, като Участникът е предложил тяхното надграждане за постигане на по-високо качество. [REDACTED]

Дейност 13. [REDACTED]

13.1.Предложение за изпълнение на дейност 13.

13.1.1.Под-дейност 13.1. [REDACTED]



Действия по изпълнение на под-дейност 13.1.

Консултантът предвижда изготвянето на Встъпителен доклад, в който ще бъде представено съдържанието на доклада по всеки от резултатите, съгл. публикувания проект на Договор, Раздел VI, чл. 9.4., в срок до 10 дни от подписване на договора. Ще бъде разработен план - график за изпълнението на дейността за постигане на навременно изпълнение на поръчката.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.1.

Встъпителният доклад ще представлява окончателната рамка за изпълнение на поръчката, в който ще бъдат фиксирани конкретни срокове за изпълнение на отделните дейности и под-дейности, както и координирана работата между участника, възложителя и други изпълнители, от чиито резултати е зависима работата по изготвяне на промоционалните материали. Ще бъде предложена структурата и съдържанието на документите, които ще се изготвят по всеки един от резултатите.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.1.

Встъпителен доклад за изпълнение на поръчката

13.1.2.Под-дейност 13.2.

Действия по изпълнение на под-дейност 13.2.

С междинния доклад за мобилното приложение ще бъдат представени разработените документи и създаденото предложение за смартфон/друго преносимо устройство, вкл. интерактивната игра. Междинният доклад ще съдържа информация за процеса на изпълнение. Към него ще бъде приложен необходимият доказателствен материал от предложените дейности и под-дейности от страна на Участника.

Междинният доклад ще бъде предоставени на Възложителя в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.2.

С междинния доклад ще бъде отчетен напредъка на дейностите, свързани с разработване на мобилното приложение.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.2.

Междинен доклад за мобилно приложение

13.1.3.Под-дейност 13.3.

Действия по изпълнение на под-дейност 13.3.

С междинния доклад ще бъде представено техническото изпълнение на дейността, свързана с разработването на уебсайта. Междинният доклад ще съдържа информация за процеса на изпълнение. Към него ще бъде приложен необходимият доказателствен материал от предложените дейности и под-дейности от страна на Участника.

Междинният доклад ще бъде предоставени на Възложителя в 1 (един)



екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.3.

С междинния доклад ще бъде отчетено изпълнението на дейностите, свързани с разработване на уебсайта.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.3.

Междинен доклад за уебсайт

13.1.4.Под-дейност 13.4. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 13.4.

С междинния доклад ще бъде представено техническото изпълнение на дейността, свързана с изработване на филма. Междинният доклад ще съдържа информация за процеса на изпълнение. Към него ще бъде приложен необходимият доказателствен материал от предложените дейности и под-дейности от страна на Участника.

Междинният доклад ще бъде предоставени на Възложителя в 1 (един) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.4.

С междинния доклад ще бъде отчетено изпълнението на дейностите, свързани с разработване на филма.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.4.

Междинен доклад за филма

13.1.5.Под-дейност 13.5. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 13.5.

С междинния доклад за информационния каталог ще бъдат представени всички предложени от Участника дейности, свързани с разработването, отпечатването и доставката на Възложителя. Към него ще бъде приложен необходимият доказателствен материал от предложените дейности и под-дейности от страна на Участника.

Междинният доклад ще бъде предоставени на Възложителя в 1 (един) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.5.

С междинния доклад ще бъде отчетен напредъкът на дейностите, свързани с изработването и отпечатването на информационния каталог.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.5.

Междинен доклад за информационен каталог

13.1.6.Под-дейност 13.6. [REDACTED]



[Handwritten signature]

Действия по изпълнение на под-дейност 13.6.

С междинния доклад ще бъдат представени всички предложени от Участника дейности, свързани с разработването, отпечатването и доставката на брошурата. Към него ще бъде приложен необходимия доказателствен материал от предложените дейности и под-дейности от страна на Участника.

Междинният доклад ще бъде предоставен на Възложителя в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.6.

С междинния доклад ще бъде отчетен напредъкът на дейностите, свързани с изработването и отпечатването на информационния каталог.

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.6.

Междинен доклад за брошура

13.1.7. Под-дейност 11.7. [REDACTED]

Действия по изпълнение на под-дейност 13.7.

Финалният доклад ще бъде представен на Възложителя след приключване изпълнението на договора. Докладът ще съдържа обобщена информация за реализираните дейности и под-дейности и постигнатите цели. Финалният доклад ще бъде предоставен на Възложителя в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му.

Аргументация относно действията, свързани с изпълнение на под-дейност 13.7.

Посоченият доклад е част от необходимата документация за отчитане на изпълнението на договора, посочен в документацията за поръчката. В процеса на изпълнение е необходимо да се поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна отчетна документация, относно извършването на възложената работа за изпълнението на договора. (чл.7.10. от проекта на договор).

Очакван резултат от изпълнението на под-дейност 13.7.

Финален доклад за изпълнението на поръчката.

13.2. Взаимовръзки между дейности/под-дейности в процеса на изпълнението им

13.2.1. Взаимовръзка 49.

Взаимовръзка 49: Взаимообвързаност между изпълнението на отделните действия, постигането на очакваните резултати и отражението след реализирането на настоящата поръчка, като дейност от проекта в общественото мнение/обществения живот/гражданското общество в Република България и в Румъния при използването на материалите.

Планираните от участника дейности на база техническото предложение, разработени в съответствие с техническата спецификация на поръчката имат за



цел създаване на качествени промоционални материали по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067. Към всеки един резултат са посочени конкретни документи/продукти, които ще бъдат генерирани в резултат на работата на Участника. Последователното изпълнение на планираните дейности е условие за постигане на очакваните резултати и ще доведе както до изпълнение на обхвата на услугата в рамките на поръчката, така и до наличието на промоционални материали, които ще послужат за промоцирането на съвместния културно-исторически туристически продукт в трансграничния регион Румъния-България и ще осигури устойчивото използване на общото римско културно наследство.

13.2.2. Взаимовръзка 50.

Взаимовръзка 50: Връзка между Встъпителния доклад и изпълнението на всички дейности

Разработването на Встъпителния доклад [REDACTED] е предпоставка за създаването на добра организация за изпълнение на всички дейности. Чрез разработване на времеви график за изпълнението ще се постигне максимална оптимизация относно времето разпределение и ангажираността на експертите. С встъпителния доклад на Възложителя ще бъде предложена и структура на съдържанието на докладите и документите, които ще бъдат изготвени при изпълнението на поръчката.

13.2.3. Взаимовръзка 51.

Взаимовръзка 51: Връзка между изготвените документи и междинни доклади и финалният доклад за отчитане цялостното изпълнение на поръчката

Изготвянето на изискуемите от Възложителя доклади са в пряка връзка с генерираните документи в процеса на изпълнение на планираните дейности. При изготвянето на междинните доклади ще бъде приложена цялата документация, генерирана в процеса на изпълнение за съответния продукт [REDACTED] на базата на които ще се създаде окончателният Финалният доклад [REDACTED]

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


II.1. Организация за изпълнение на отделните дейности/под-дейности

Организацията на работата и разпределението на дейностите следва последователността на дейностите и резултатите, описани в Методология за изпълнение на обществената поръчка. С цел повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания са включени допълнителни експерти. За да бъде



подсигурена най-добрата организация за извършване на всички дейности, максимална гъвкавост и единство на резултатите от всички дейности, предлагаме като цяло структурата на екипа на Изпълнителя да бъде следната:

Схема 2. Организационна структура на екипа

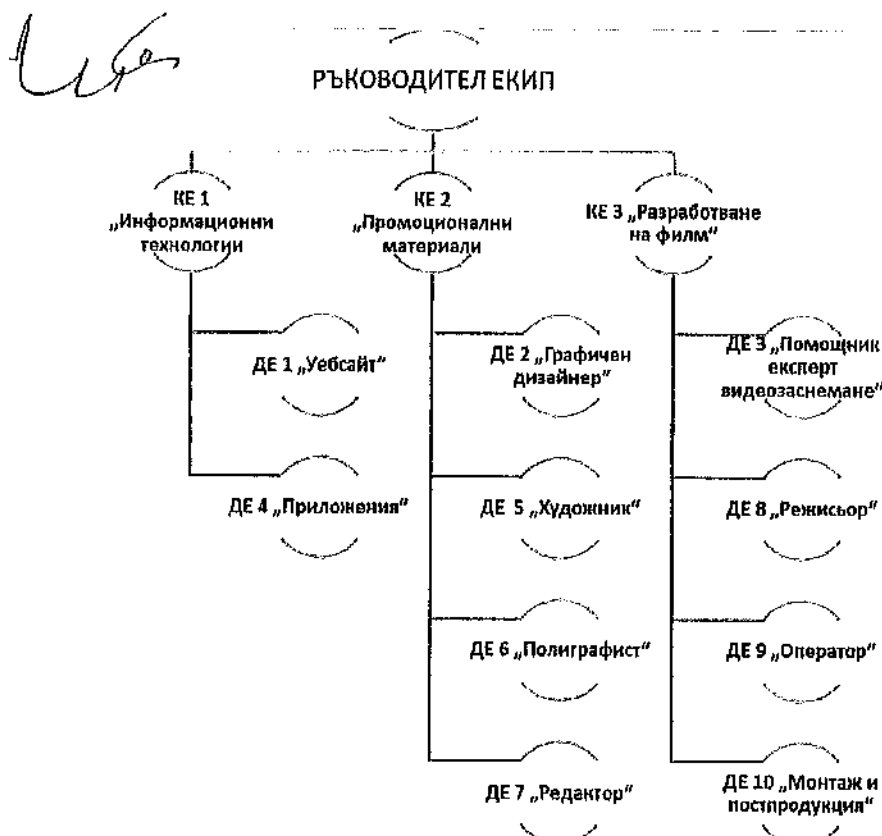

II.2. Предложение за действията и функциите на експертите

Действията и функциите на всеки конкретен експерт при изпълнението на дейностите по поръчката е подробно описано в следващата таблица, като са съобразени с предвидените за съответния експерт работи, които ще му бъдат възложени, вкл. създаване на синхронизация в работата на отделните експерти при изпълнение на всяка една от дейностите и под-дейностите.

2.1. Действия и функции на ключовите експерти

ЕКСПЕРТ	ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ
Ръководител екип	Функции:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Действия:

Отговаря пряко за изпълнението на следните под-дейности:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Ключов експерт 1
„Информационни
технологии“

Функции:

Действия:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ПАРЛАМЕНТ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО




Interreg



ЕКСПЕРТ


ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

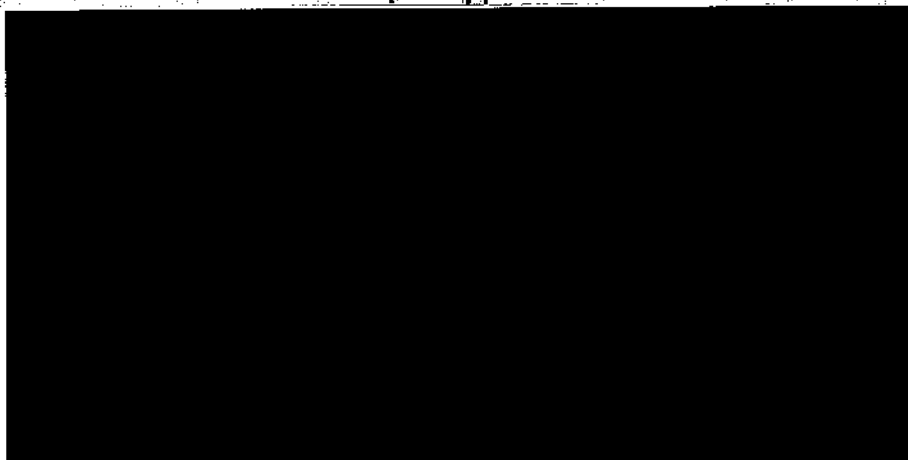

Подпомага и участва в дейностите по:



Отговаря пряко за изпълнението на следните под-дейности:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ПУБЛИЧНИ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО




Interreg



[Handwritten signature]

ЕКСПЕРТ


ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ



Участва в изпълнението на дейностите, посочени в Таблица 1., съобразно своята експертиза и взаимодействието с останалите експерти за изработване на промоционалните материали

Ключов експерт 2
„Промоционални
материали“

Функции:



[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Действия:

Отговаря пряко за изпълнението на следните под-
действия:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA-BULGARIA




Interreg



[Handwritten signature]

ЕКСПЕРТ


ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ




Участва в изпълнението на следните дейности:
посочени в Таблица 1., съобразно своята експертиза и
взаимодействието с останалите експерти за изработване на
промоционалните материали

Ключов експерт 3
„Разработване на
филм“

Функции:



Действия:



[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Отговаря пряко за изпълнението на следните под-
дейности:

Участва в изпълнението на следните дейности:
посочени в Таблица 1., съобразно своята експертиза и
взаимодйствието с останалите експерти за изработване на
промоционалните материали

2.2. Действия и функции на допълнителните експерти

ЕКСПЕРТ

Допълнителен
експерт 1
„Уебсайт“

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Функции:

Действия:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ПРАВОСЪДНО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA-BULGARIA




Interreg



[Handwritten signature]

ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ



Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
експерт 2
„Графичен
дизайнер“

Функции:



[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg




ЕКСПЕРТ:

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:



Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
Експерт 3

Функции:



97



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ROMANIA
ROMÂNIA



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

INTERREG



Interreg



ЕКСПЕРТ

„Помощник
експерт
видеозаснемане“

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ




Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:



Допълнителен
Експерт 4
„Приложения“

Функции:



Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО




Interreg



ЕКСПЕРТ


ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

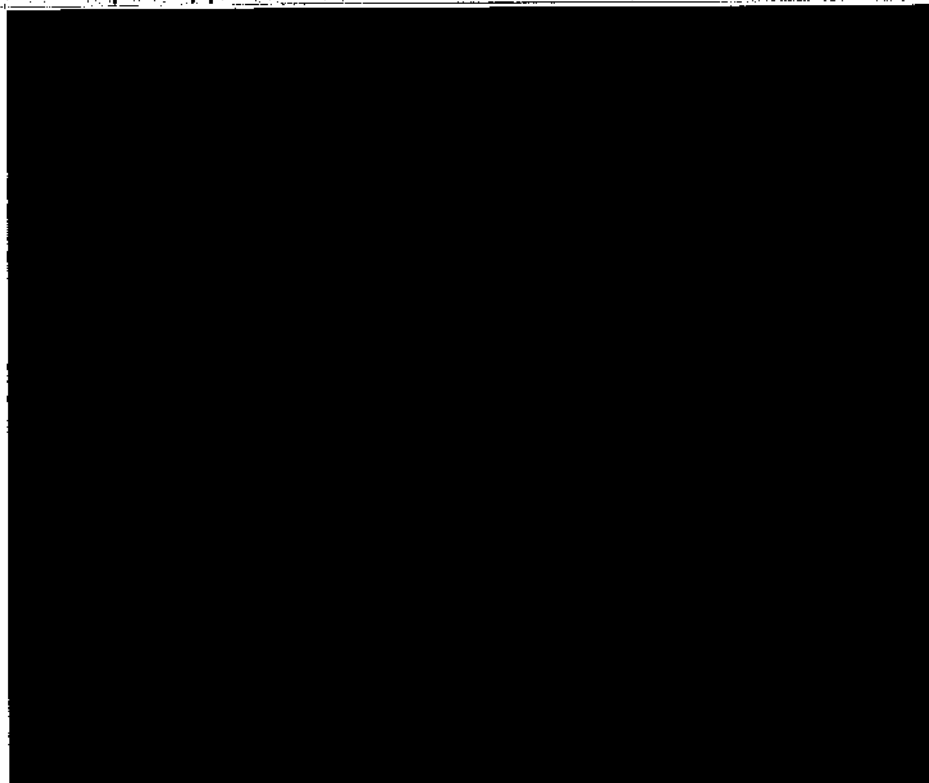

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
Експерт 5
„Художник“


Функции:



Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:

Ангажиментите му са свързани конкретно с изпълнението на следните дейности:





ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Допълнителен
Експерт 6
„Полиграфист“

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Функции:

Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:

Ангажиментите му са свързани конкретно с изпълнението на следните дейности:

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
Експерт 7
„Редактор“

Функции:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ПАРЛАМЕНТ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:

Ангажиментите му са свързани конкретно с изпълнението на следните дейности:

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
Експерт 8
„Режисьор“

Функции:

Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
Експерт 9
„Оператор“

Функции:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



ЕКСПЕРТ

ФУНКЦИИ / ДЕЙСТВИЯ

Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Функции:

Действия:

Участва в изпълнението на следните дейности:

Подпомага, според компетенциите си и необходимостта от осъществяване на връзка с работата на другите експерти, съгл. Таблица 1.

Допълнителен
Експерт 10
„Монтажист и
постпродукция“

II.3. Описание на начините на разпределение на дейностите и отговорностите между всеки един от експертите

За изпълнение на настоящата поръчка е предложена организационната структура на екипа е от линеен тип, което предполага лесна комуникация в рамките на целия екип. Това дава възможност за дискусия по процеса на работа между проблемите целия екип и достъп до информация.

Положителните страни на този вид структура са следните: тя е опростена и съобразена с изискванията на дейността; съставът на специалистите с ръководни функции е оптимален, и нормалният управленчески процес не се затормозява; формата на управление, както и експертите, които я реализират, позволява да се вземат бързо и оперативно ръководни решения; организационната структура на управление способства за създаване на благоприятен климат във взаимоотношенията между експертите и ръководителя на екипа.

Тя се характеризира с: Единна точка на отчетност/отговорност; Контрол на качество и поддръжка на напредъка; Адекватност на предложените човешки, технически и други ресурси в условията на опита и броя налични експерти, по начин, гарантиращ че изискванията на договора ще бъдат постигнати.



Начело на екипа консултанти стои Ръководител на екипа, чиито квалификация и професионален опит отговарят на изискванията в Техническата спецификация на поръчката.

Под прякото ръководство на ръководителя на екипа са ключовите експерти. Допълнителните експерти са под ръководството на ключовите експерти, както е показано в организационната структура.

Взаимодействието с Възложителя се осъществява от Ръководителя на екипа.

Процедури за контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и/или възложителя включва набор от основни мерки, главни сред които са:

_____ - веднага след подписването на договора експертите ще се запознаят с допълнителната информация, документи и материали, предоставени от Възложителя, с цел екипът на Участника да може точно да планира работата си по изпълнението на договора в предварително обявения от Възложителя срок.

_____ - както при разпределението на задачите, така и при тяхното изпълнение (включително контрола върху изпълнението), ще се спазва йерархичната структура в рамките на обединението, за да е възможно правилното и навременното изпълнение на всички дейности или под-дейности.

_____ - след като всеки един от експертите (ключови и допълнителни) в екипа на участника е запознат с конкретните задачи и отговорности, се пристъпва към същинското изпълнение на отделните дейности и под-дейности. Ще се спазват стриктно инструкциите, определени в предходните етапи, както и организацията на работата, пряко влияеща върху точното и навременно изпълнение на поръчката съобразно работния план-график, който ще бъде разработен в началото на изпълнението на договора, след обсъждане и съгласуване с Възложителя.

_____ - проекти на готовите документи, разработени в рамките на поръчката, при необходимост и наличие на съгласие ще бъдат предавани на Възложителя за предварително съгласуване и одобрение, с оглед отразяване на коментари и своевременно отстраняване на забележки, в съответствие с изискванията, подробно описани в Техническата спецификация.

_____ Интензитетът на разработване на промоционалните материали, както и тяхната специфика изискват осъществяване на текущо консултиране с възложителя на отделни етапи от изготвянето им. Затова ще бъде осъществено текущо консултиране, което е описано в раздел I, за съответната дейност/ под-дейност за която е необходимо.

_____ - участникът ще е на разположение на Възложителя за активна комуникация при възникнала необходимост от промени и оказване на помощ от страна на експертния екип по време на изпълнение на всяка една от предвидените дейности и под-дейности.

_____ - по време на целия период на изпълнението на дейностите по договора Ръководителят упражнява непрекъснат контрол върху работата на целия екип, ангажиран с изпълнението на поръчката и следи за правилното, законосъобразно и точно изпълнение на отделните задачи.



_____ - при изпълнение на всички дейности/под-дейности участникът ще следва стриктно разпоредбите на действащото законодателство. В допълнение, в случай, че Консултантът бъде избран за изпълнител, ще осъществява изпълнението на задълженията си на посочения по-долу идеен подход и произтичащите от прилагането му решения, базирайки се на следните механизми, основни процедури и схеми на взаимодействие с Възложителя;

_____ Всички изложени по-долу фактори са от съществено значение, но реализирането на работата по договора в сътрудничество с Възложителя е от критична важност. Установяването на работни контакти с Възложителя и при необходимост с избраните изпълнители на други дейности от проекта, от чиито резултати е зависима работата на Участника в настоящата процедура, поддържане на постоянна обратна връзка и периодично докладване и обсъждане на разработките, използване на реализацията на дейностите/под-дейностите по договора са от изключителна важност. Това аргументира сътрудничеството като задължително условие резултатите от дейностите на участника да отговорят пълно и адекватно на реалните потребности.

_____ Изпълнението на настоящия договор изисква организация и отлично взаимодействие на екипа. Добрата организация на екипа ще позволи качествената реализация на дейностите/под-дейностите в заложените срокове.

_____ Бъдещият изпълнител по договора носи цялата отговорност по постигане на заложените резултати. Успешното и в срок изпълнение на договора е решаващо с оглед възможното настъпване на правни последици, които биха могли да се оценят като неблагоприятни. Затова всички дължими действия ще бъдат извършени с професионалната отговорност на екипа на Участника.

_____ Задачите по договора следва да се извършат в поставения срок, като обвързаността между отделните дейности и под-дейности прави спазването на поставените при изпълнение междинни срокове един от най-важните елементи за успешната реализация. Стриктното придържане към работния план-график за изпълнение на дейностите и спазване на поставените срокове е от голямо значение по три основни причини. Първо, това води до навременно изпълнение на договорените отношения и предоставяне на резултатите от дейностите. Второ, спазването на сроковете повишава доверието между изпълнителя и получателя на резултатите - Възложителя. Трето, това показва професионално отношение към задълженията.

За ефективното изпълнение на дейностите/под-дейностите и постигането на предвидените резултати, участникът ще концентрира ресурсите си върху няколко основни елементи:

Отлично сътрудничество и свободен и навременен обмен на информация между екипа на Участника и Възложителя, както и предоставяне на всякакъв тип информация и съдействие при поискване от страна на Възложителя;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ROMANIA - BULGARIA
Interreg

Управленска структура, проектирана така, че да събере в едно допълващи се умения в рамките на интегриран, балансиран и конкретен екип от експерти с необходимото ниво на познание;

Контролиране спазването на заложената последователност и проследяване качествено изпълнение на възложените дейности/под-дейности;


Информирание за всеки открит или неразрешен въпрос, касаещ подготовката и изпълнението на договора с кореспонденция до Възложителя или негови представители;

Участие в анализирането на докладваната информация от отделните участници в процеса;

Гъвкавост и адаптиране при цялостното осъществяване на дейностите/под-дейностите по отношение на законодателни и/или икономически промени, с цел устойчивост на изпълнението.

II.4. Връзка и съответствие между предвидената организация за изпълнение и предложението за мобилизацията и разпределението на използваните човешки ресурси

Организацията за изпълнение на поръчката и предложението за мобилизация и разпределение за използваните човешки ресурси е:



Разпределението на дейностите и задачите на екипа и продължителността на задачите са показани в Таблица 1. Разпределение на дейностите между експертите по дейности/ под-дейности.

Таблица № 1. Разпределение на дейностите между експертите по дейности/ под-дейности

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител евип	Ключови експерти			Допълнителни експерти									ДЕ 8 „Ремисор“	ДЕ 9 „Оператор“	ДЕ 7 „Монтаж и постпродукция“
		КЕ 1 „Информационни технологии“	КЕ 2 „Промоционални материали“	КЕ 3 „Разработване на филми“	ДЕ 1 „Уебсайт“	ДЕ 2 „Графичен дизайнер“	ДЕ 3 „Помощник експерт видеоредактиране“	ДЕ 4 „Приложения“	ДЕ 5 „Художник“	ДЕ 6 „Толмиграфист“	ДЕ 7 „Редактор“					
	отговаря	участва	участва	участва								участва				
	отговаря	участва	участва	участва						участва		участва				
	отговаря	участва	участва	участва	участва			участва	участва		участва	участва				
		участва	отговаря	участва	участва	участва		участва	участва							
	отговаря	участва	участва	участва												
		отговаря			участва											

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



44

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител екип	Ключови експерти			Допълнителни експерти										
		KE1 "Информационни технологии"	KE2 "Промисловост и материали"	KE3 "Разработване на филм"	DE1 "Уебсайт"	DE2 "Графичен дизайн"	DE3 "Помощник експерт видеонаблюдение"	DE4 "Приложение"	DE5 "Художник"	DE6 "Полиграфист"	DE7 "Редактор"	DE8 "Режисьор"	DE9 "Оператор"	DE7 "Монтаж и постпродукция"	
	Дейност 2.														
	участва	отговаря	участва			участва		участва							
	участва	отговаря	участва			участва		участва	участва						
	участва	отговаря	участва		участва	участва			участва		участва			участва	
	участва		участва	отговаря					участва		участва	участва		участва	
	участва		отговаря			участва			участва		участва				
	участва		отговаря			участва					участва				
	отговаря	участва	участва	участва											

107




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

БЪЛГАРСКО ПРАЗВИТЕСТВО



405

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител експерт	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		КЕ 1 „Информационни технологии“	КЕ 2 „Промисловите материали“	КЕ 3 „Разработване на филм“	ДЕ 1 „Уебсайт“	ДЕ 2 „Графичен дизайнер“	ДЕ 3 „Помощник експерт видеоизображение“	ДЕ 4 „Приложението“	ДЕ 5 „Художник“	ДЕ 6 „Политрафикт“	ДЕ 7 „Редактор“	ДЕ 8 „Режисьор“	ДЕ 9 „Оператор“	ДЕ 10 „Монтаж и реставрация“
	участва	отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва	участва		участва	участва					
		отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва									
	участва	отговаря						участва						
	участва	отговаря												

Handwritten signature



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ




МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА



МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА



МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

45

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител енип	Ключови експерти			Допълнителни експерти			Дейност 4:			Дейност 5:		
		KE 1 "Информационни технологии"	KE 2 "Промоционални материали"	KE 3 "Разработване на филм"	DE 1 "Уебсайт"	DE 2 "Графичен дизайнер"	DE 3 "Почти експерт видеоизготвяне"	DE 4 "Приложения"	DE 5 "Художник"	DE 6 "Полиграфист"	DE 7 "Редактор"	DE 8 "Режисьор"	DE 9 "Оператор"
	участва	отговаря						участва					
		отговаря			участва	участва		участва	участва				
	отговаря	участва	участва	участва									
	участва	отговаря			участва			участва				участва	
		отговаря			участва			участва					
		отговаря			участва			участва					
		отговаря			участва			участва					
	отговаря	отговаря			участва	участва		участва	участва				
		отговаря			участва			участва					
		отговаря			участва			участва					

Handwritten signature

Handwritten signature



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ТРАЗИТЕЛСТВО



interreg

5K

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител екип	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		KE 1 "Информационни технологии"	KE 2 "Промоционални материали"	KE 3 "Разработване на филми"	DE 1 "Уебсайт"	DE 2 "Графичен дизайнер"	DE 3 "Помощник експерт видеозаписване"	DE 4 "Приписки"	DE 5 "Художник"	DE 6 "Политрафист"	DE 7 "Редактор"	DE 8 "Режисьор"	DE "Оператор"	DE 7 "Монтаж и постпродакшън"
		отговаря			участва	участва		участва			участва			
	участва	отговаря			участва		участва							
	участва	отговаря			участва		участва							
Дейност 6.														
				отговаря		участва			участва		участва	участва		участва
				отговаря				участва			участва	участва	участва	
				отговаря				участва			участва	участва	участва	участва
				отговаря				участва				участва	участва	участва
				отговаря					участва			участва	участва	участва
				отговаря						участва	участва	участва		
				отговаря			участва					участва	участва	участва

Handwritten signature



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



interreg



48

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител всич	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		KE 1 „Информационни технологии“	KE 2 „Промисловите материали“	KE 3 „Разработване на филми“ отговаря	DE 1 „Уебсайт“	DE 2 „Графичен дизайн“ участва	DE 3 „Помощник експерт видеозаснемане“	DE 4 „Приложения“	DE 5 „Художник“ участва	DE 6 „Голиграфист“	DE 7 „Редактор“	DE 8 „Режисьор“ участва	DE „Оператор“	DE 7 „Монтаж и постпродукция“ участва
Дейност 7.														
				отговаря				участва				участва		
				отговаря				участва				участва		

48

48



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО УПРАВЛЕНИЕ



interreg

12

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител експерт	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		КЕ 1 „Информационни технологии“	КЕ 2 „Процесионални материали“	КЕ 3 „Разработване на сайт“	ДЕ 1 „Уебсайт“	ДЕ 2 „Графичен дизайн“	ДЕ 3 „Помощник експерт видеосъхраняване“	ДЕ 4 „Приложения“	ДЕ 5 „Художник“	ДЕ 6 „Полиграфист“	ДЕ 7 „Редактор“	ДЕ 8 „Ревизор“	ДЕ 9 „Оператор“	ДЕ 7 „Монтаж и постпродажба“
			отговаря			участва			участва					
			отговаря			участва			участва	участва				
	участва		отговаря			участва			участва	участва				
Дейност 8.														
			отговаря			участва			участва		участва			
			отговаря			участва			участва					
	участва		отговаря			участва								

12



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКОТО БЪДЕЩЕ



РОДИТЕЛСТВО

hh

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител екип	Ключови експерти			Допълнителни експерти								
		КЕ 1 „Информационни технологии“	КЕ 2 „Промоционални материали“	КЕ 3 „Разработване на филм“	ДЕ 1 „Уебсайт“	ДЕ 2 „Графичен дизайнер“	ДЕ 3 „Помощник експерт видеозаписване“	ДЕ 4 „Помощник“	ДЕ 5 „Художник“	ДЕ 6 „Политрафист“	ДЕ 7 „Редактор“	ДЕ 8 „Режисьор“	ДЕ 9 „Монтаж и гостоприемство“
			отговаря			участва			участва		участва		
	участва	участва	отговаря		участва						участва		
	участва		отговаря										
			отговаря		участва				участва				
			отговаря		участва				участва	участва			
	отговаря		участва							участва			

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Handwritten signature

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител екип	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		КЕ 1 „Информационни технологии“	КЕ 2 „Промоционални материали“	КЕ 3 „Разработване на филм“	ДЕ 1 „Уебсайт“	ДЕ 2 „Графичен дизайн“	ДЕ 3 „Помощник експерт видеосъздаване“	ДЕ 4 „Приложения“	ДЕ 5 „Художник“	ДЕ 6 „Дизайнер“	ДЕ 7 „Редактор“	ДЕ 8 „Режисьор“	ДЕ 9 „Оператор“	ДЕ 10 „Монтаж и постпродакшън“
Дейност 9.														
	отговаря	участва			участва			участва						
		отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва			участва						
		отговаря			участва			участва			участва			
				отговаря							участва	участва	участва	участва
					отговаря									
			отговаря								участва			
			отговаря								участва			

Handwritten signature

www.interregbrog.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Handwritten signature

hG

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител екип	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		КЕ 1 „Информационни технологии“	КЕ 2 „Промисловите материали“	КЕ 3 „Разработване на СММ“	ДЕ 1 „Уебсайт“	ДЕ 2 „Графичен дизайн“	ДЕ 3 „Плюс/минус експерт“ „Видеосъветник“	ДЕ 4 „Приложения“	ДЕ 5 „Художник“	ДЕ 6 „Полиграфист“	ДЕ 7 „Редактор“	ДЕ 8 „Ремисор“	ДЕ 9 „Оператор“	ДЕ 7 „Монтаж“ и „Постпродакшн“
Дейност 10.														
	участва	отговаря			участва	участва		участва						
	участва	отговаря			участва			участва						
	участва	отговаря				участва		участва						
	участва	отговаря			участва	участва								
Дейност 11.														
	отговаря			участва										
				отговаря			участва							
				отговаря			участва			участва				
	участва			отговаря										
Дейност 12.														
	отговаря		участва							участва				
			отговаря											

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



БЪЛГАРСКО ГРАВИТЕСТВО



interreg

2006-2013

ДЕЙНОСТ / ПОД-ДЕЙНОСТ	Ръководител екип	Ключови експерти			Допълнителни експерти									
		KE 1 „Информационни технологии“	KE 2 „Промоционални материали“	KE 3 „Разработване на филми“	DE 1 „Уебсайт“	DE 2 „Графичен дизайн“	DE 3 „Помощник експерт видеоиздание“	DE 4 „Приложения“	DE 5 „Художник“	DE 6 „Полиграфист“	DE 7 „Редактор“	DE 8 „Режисьор“	DE 9 „Оператор“	DE 7 „Монтаж и постпродукция“
	участва		отговаря											
	отговаря		участва						участва					
			отговаря						участва					
	участва		отговаря											
Дейност 13.														
	отговаря	участва	участва	участва										
	участва	отговаря					участва							
	участва	отговаря			участва									
	участва			отговаря								участва		
	участва		отговаря											
	участва		отговаря							участва				
	отговаря	участва	участва	участва										

[Signature]

www.interregbgbg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

[Signature]



III. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО

III.1.Подход за управление на качеството

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“, изисква прилагането на ефективна система за осигуряване на качеството, която не застрашава напредъка на договора.

Целта на управлението на качеството е да се потвърди, че качеството на резултатите, получени от изпълнението на поръчката, е на добро ниво. Управлението на качеството в рамките на поръчката, гарантира качеството на резултатите по целия проект и качеството на процесите, използвани за управление и създаване на резултатите.

Основен приоритет е удовлетвореността на Възложителя, качеството на извършената работа и подобряване на ефикасността на дейностите по изпълнение на настоящата поръчка.

В рамките на екипа е предвидено ръководителят на екипа да следи за спазване на процедурите по качеството: спазване на административните процедури и сроковете, ще бъде ангажиран по контрола и проверката на документите и резултатите от дейностите.

За гарантиране ангажиментите на двете дружества, обединени за целите на настоящата поръчка се предвижда да бъде разработен План по качеството. В него ще бъдат включени всички мерки, необходими за изпълнение обхвата на настоящата поръчка. Целта е да се осигури качество при изпълнение на всички предвидени дейности и под-дейности, както и да се гарантира ефективното взаимодействие на двамата партньори, формирали обединението. В плана по качество ще бъдат включени и мерките, посочени в настоящия раздел от Техническото предложение, които са идентифицирани в процеса на изготвянето му.

Консултантът се ангажира с качествено и в срок изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация и за тази цел ще прилага посочените по-долу мерки, които са приложими и засягат в еднаква степен всяка една от дейностите поотделно, както и в по-широк смисъл - цялостното изпълнение на договорните задължения, произтичащи от условията на поръчката.

III.2.Мерки за осигуряване на качеството


Мярка 1. [REDACTED]

Осъществяването на вътрешния контрол за гарантиране качеството и постигането на желаните резултати ще се извършва чрез спазването на процедурите, предвидени за включване в Плана за качество, преглед от



ръководството, добро управление на ресурсите и измерване, анализ и подобряване на резултатите.

За осъществяването на добър вътрешен контрол, Консултантът определя като ключови следните аспекти:



Предложени са действия и функции на всеки от експертите (ключови и допълнителни), съобразени с предвидените за съответния експерт работи, които ще му бъдат възложени, вкл. предложение за създаване на синхронизация в работата на отделните експерти при изпълнение на всяка една от дейностите и под-дейностите е дадено в раздел II. от настоящото техническо предложение.

В раздел II. Организация на работата са описани организацията за изпълнение на отделните дейности и съставлящите ги под-дейности, необходими за изпълнението на поръчката и организационната структура на екипа, вкл. разпределение на ресурсите.

При осъществяването на вътрешния контрол ще се следи за изпълнението на действията от страна на всеки от експертите в срок и ще се оценява качеството на тяхната работа.

Всяка задача по проекта ще има своя специфична мярка и оценка на качеството. За осигуряване на качеството са идентифицирани следните основни компоненти, посочени в Таблица 2.

Таблица 2. Основни елементи при управление на качеството

Предмет на преглед	на на	Мярка на качеството	Оценка на качеството
Резултати (доклади) задачи	и	Пълнота, точност и изчерпателност.	Дейностите по контрол на качеството имат за цел да следят и проверяват дали получените резултати отговарят на определени изисквания за качество съгласно техническото задание.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО




Interreg



Предмет на преглед	Мярка на качеството	Оценка на качеството
Работни процеси и процедури	Стандарти за качество на процесите и процедурите. Това са мерките, използвани за определяне на успешен изход за даден резултат в обхвата на поръчката.	Дейности за осигуряване на качеството, които следят и проверяват дали процесите, използвани за управление и създаване на резултати отговарят на определени стандарти за качество.

Относно дейностите в обхвата на поръчката, ще бъдат определени конкретните отговорности на ключовите експерти от ръководителя на екипа, като той ще следи за навременното и качествено изпълнение на задачите.

Ще бъдат извършени следните дейности:



Ресурсите, които обединението планира и осигурява, са човешки, финансови, информационни и инфраструктурни. Наличието на достатъчно ресурси е условие за ефективното функциониране ефективното изпълнение на задачите, целите и графика на поръчката.

Прегледът на състоянието на ресурсите, необходимостта от нови и допълнителни ресурси, тяхното планиране и осигуряване се извършва от Ръководителя на проекта или ключовите експерти.

Човешки ресурси

Човешките ресурси, отделени от дружествата - участници в обединението за целите на поръчката, са изброени в Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение 12).

За целите са предвидени допълнителни експерти, които чрез своята експертиза ще осигурят качествено изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.

Всички участници в екипа ще получават входящи инструкции от Ръководителя. Ще бъдат уведомявани от него за всички настъпили промени в първоначалните параметри на договора, към които имат отношение. Уведомяването става по един от начините на вътрешна комуникация.

Оценка на представянето на всеки член на екипа се прави от ръководителя на екипа, който отговаря за предоставените експерти от фирмите - партньори в обединението, след приключването на работата им по съответната под-дейност.

Инфраструктура

Наличието на достатъчна и качествена инфраструктура е абсолютно условие за постигане на целите на поръчката. Затова ръководството е определило необходимата инфраструктура - офиси, поддържани от фирмите-партньори,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ПАРЛАМЕНТАРИЗМЪТ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

КОНАК - БУДНА

Interreg



техника за изработване на мобилните приложения, снимачна техника и офис техника.


Работна среда

Ръководството на всяко от дружествата - участници в обединето, носи отговорност за определянето и осигуряването на адекватна и съобразена със съответното национално законодателство работна среда.

Изпълнителят планира и прилагането на наблюдение, измерване, анализ и подобряване на процесите и резултатите от дейността си с цел да докаже съответствието на изготвените промоционални материали с установените от Възложителя изисквания и да осигури адекватността на действията и резултатите спрямо качествено изпълнение на целите на поръчката.

Събираната информация се преглежда от ръководството на двете дружества и ръководителя на екипа и служи за вземане на решения за коригиращи и/или превантивни действия.

Наблюдение и измерване на продукта/резултата от дейността:




Настоящите процедури са приложими към поръчката, като разпределението на задачите е извършено индивидуално спрямо предложения екип и поддейностите необходими за изпълнение на поръчката.

Мярка 2.

Мониторингът е процес на систематично и продължително събиране, анализиране и използване на информация за целите на управлението и вземането на решения при изпълнението на проекта. Той има за цел да установи доколко изпълнението съответства на договореното, а също и да предостави количествена и качествена информация, чрез която да бъдат измерени ефективността и ефикасността от изпълнението на проекта. Информацията се базира на индикатори, които са заложили в проекта. Мониторингът се осъществява посредством подготовка и проверка на различните видове доклади.


Мониторингът ще се използва за:



При старта на работа по изпълнение на настоящата поръчка Изпълнителят ще пристъпи към организация на основните екипи и функционални звена, чрез които възнамерява да изпълни дейностите описани в техническото предложение.

Основните функционални звена, водени от ключовите експерти са, както следва:

Схема 3.

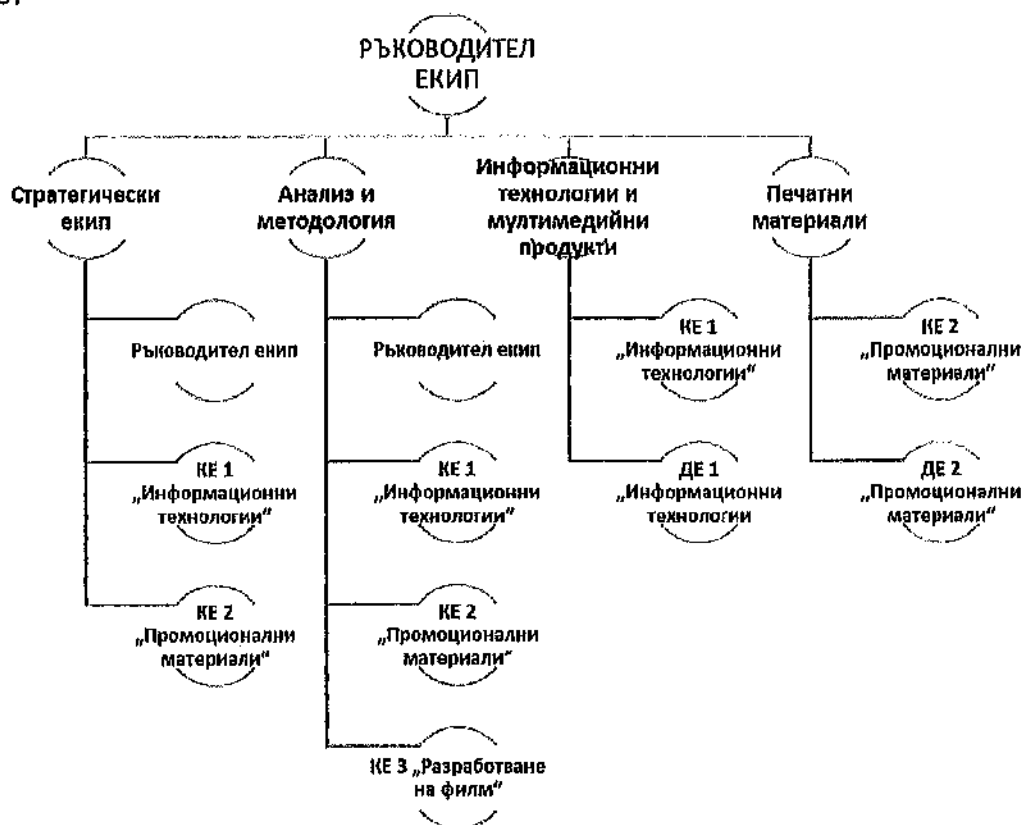

За целите на поръчката, Изпълнителя предвижда използването на система за управление на процеси..

Платформата е проектирана и предназначена да осигури ефективна среда за комуникация на различни експерти и да осигури възможност и инструменти да бъдат решавани отделни проблеми и задачи свързани с постигането на предварително поставени цели.

Концепцията на платформата е свързана с постигане на синергия на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



ROMANIA



БЪЛГАРСКО УПРАВЛЕНИЕ

ROMANIA-BULGARIA



Interreg



наличните човешки ресурси и know-how и с оценка на използването им и резултатите.

Натрупаните във времето опит и бизнес практики са достъпни чрез онлайн базирана платформа, наречена [REDACTED], който ще бъде използван за реализацията на проект. Платформата позволява поддържане на актуална информация за участието на всеки един експерт в даден проект и проследяване на всяка една негова дейност.

[REDACTED] е била използвана и преди за подобни проекти, проектиране и сътрудничество.

[REDACTED] предоставя следните услуги на организацията:





Схема 4. Технологии предвидени в поръчката



Изпълнителят ще използва платформено независими езици и инструменти при изграждане на технологиите заложили в проекта. Основна идея при разработването е езикът да бъде платформено независим, за да могат

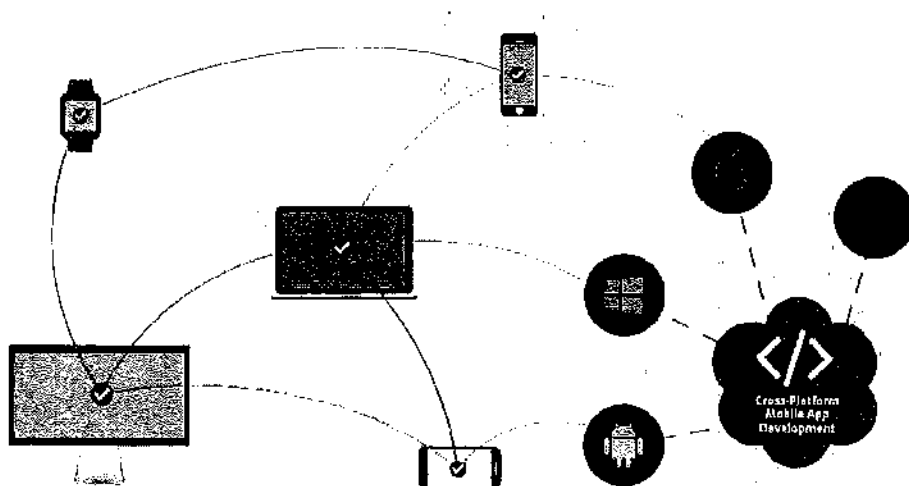

програми, написани на него, да се изпълняват на различни системи, работещи с различни операционни системи.

Използването на мощен съвременен език за програмиране допринася за бързодействието и актуалността на технологичните решения, като:

- HTML5;
- C;
- Java;
- JavaScript;
- SQLite;
- JQuery;
- Cross-browser, CSS3, други;
- и други.

Мярка 3. [REDACTED]

Участникът формулира тази мярка във връзка със спазване и изпълняване на изискванията по отношение на информацията и публичността, заложи в глава II, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕО) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

Съгласно разпоредбите на чл.7.17. от публикувания проект на договора, Участникът, трябва да спазва задължението, когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие и националните фондове на Румъния и България са финансирали проекта.

В тази връзка Консултантът ще прилага мярката за спазване на изискванията за визуализация и публичност, както следва: При оформяне на документите, генерирани в рамките на поръчката; При изработване на презентационните материали и информационните материали за кръглите маси; При изготвяне на докладите; Всички документи, изработени в рамките на договора ще отговарят на Наръчника за визуализация по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., в съответствие с изпълнение на чл. 7.16. и чл.7.17 от проекта на Договор. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Румъния и България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган и останалите компетентни органи и лица на Програмата“.



Мярка 4.

Тази мярка за осигуряване на качество се счита от Участника за една от най-важните за качествено изпълнение на поръчката и успешното имплементиране на проекта. Предвижда се да бъдат задълбочено проучени всички създадени продукти на проекта: предварително проучване, стратегия за развитие, маркетингова стратегия на туристическия продукт и другите промоционални материали, разработени от различни изпълнители. Чрез прилагането на тази мярка, ще се постигне изпълнение на поръчката с необходимото качество по отношение на изготвените промоционални материали.

Мярката за осигуряване на качество ще бъде осъществена чрез изпълнението на Дейност 1.

Тази мярка за осигуряване на качеството е от ключово значение още в началото на проекта, за да се гарантира качествена информационна база при разработването на концепциите за промоционалните продукти и при тяхното изпълнение. По този начин се гарантира интегритет и приемственост на всички дейности в рамките на проекта.

Мярка 5.

Установяването на добра комуникация е от съществено значение за осигуряването на качествено изпълнение на поръчката. Осигуряването на непрекъснат достъп до информация, ясни въпроси и срокове за отговор и предоставяне на информацията, спомагат за качествено и навременно изпълнение на задачите.

Необходимо е определянето на контактни лица от страна на Възложителя, като от страна на Участника това ще бъдат ръководителят на екипа, който ще упражнява управленски контрол върху работата.

Процедури по изготвяне на кореспонденция

Осигуряването на текуща и навременна комуникация ще подпомогне процеса на контрол на качеството на работата от страна на Участника. Официалната кореспонденция ще се осъществява от представляващия и управляващия консорциума и ръководителя на екипа към Възложителя в писмена форма. При кореспонденция от оперативен характер ще се използват канали за комуникация като телефон и електронна поща.

Таблица 3. Процедурата по изготвяне на кореспонденцията обхваща:

Елементи на процедурата	Описание
Страни в кореспонденцията	Консултант; Възложител; трети страни
Видове кореспонденция	Писмена - на хартиен носител и електронен носител Устна



Елементи на процедурата	Описание
Вид кореспонденция и случаи на прилагане	Писмена кореспонденция във връзка с изпращане на писма и хартиен и електронен носител, свързана с изпълнение на задължения по Договора. Устна кореспонденция във връзка с извършване на текущ контрол на изпълнители; уведомяване на Възложителя за възникнали рискове; оказване на съдействие; координация със заинтересовани страни и други.
Отговорни лица за осъществяване на различните видове кореспонденция	Писмена - Ръководител екип, Представляващ и управляващ консорциума Устна - всички членове на екипа

Процедура по изготвяне, предоставяне и одобрение на доклади

В хода на изпълнение на поръчката ще бъдат приемани и предавани различни документи/доклади, свързани с постигането на конкретните резултати от изпълнението на поръчката.

Всички доклади и документи ще бъдат проверявани от ръководителя с цел осигуряване на качеството.

Планирането на създаването на докладите се основава на насоките и очакванията на и договореното с Възложителя, включително:

- [REDACTED] с всички предходни разработки в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ и други относими документи от значение за изпълнението на целите на поръчката;
- [REDACTED] по отношение на сроковете и недопускане на забавяне при изпълнението на дейностите/под-поддейностите;
- [REDACTED] на екипа за навременна реакция при променящи се условия;
- [REDACTED] на екипа със задачите по неговото изпълнение;
- [REDACTED] на рисковете, свързани с изпълнението на поръчката, върху които може да се оказва въздействие и контрол от страна на Участника;
- [REDACTED] на Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнение на работата по проекта и формулиране на предложения за отстраняването им от страна на Участника;
- [REDACTED] от страна на Участника на всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя;
- [REDACTED] на крайните продукти: приложение за смартфон/ друго преносимо устройство, вкл. интерактивна игра, уебсайт, филм, информационен каталог и брошура, необходими за промоцирането на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Interreg



съвместния културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

- [REDACTED] от страна на Консултанта на Договора с Възложителя.

Процедурата по изготвяне, предоставяне и одобрение на доклади е следната:

Таблица 4. Процедура по изготвяне, предоставяне и одобрение на доклади

Стъпка	Участници	Забележка
	Ръководство	
	Ключови експерти и екипа от допълнителни експерти	Задължително съгласуване на външните документи, на основата на които се изготвя продукта.
	Ръководител екип Ключови експерти	Задължителна проверка за спазване на Графика, Договора с Възложителя
	Екип на Изпълнителя	
	Ръководител екип	
	Ръководител екип	Съгл. изискванията на Възложителя в Техническата спецификация предаването на документацията за съответния резултат се осъществява чрез приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя, с указани дата, дейност и оценка на качеството на извършената работа.
	Възложител	Съгл. чл.9.5.т.2. от проекта на договор „Комисия на Възложителя разглежда материалите/документацията за резултата, като в 5 дневен



[Handwritten signature]

		срок изготвя Протокол за приемане или връщане за корекции.
	Ръководител екип, Ключов експерт от съответната област	Съгл. чл.9.5.т.2. от проекта на договор „При необходимост от корекции - в 3 дневен срок Изпълнителят трябва да отстрани
	Ръководител екип	неточностите/нередностите и да предаде редактирания материал на Възложителя.“
	Ръководител екип	
	Възложител	Съгл. чл.9.5.т.3. от проекта на договор одобрението се осъществява въз основа на Протокола/ите с решенията на Комисията за приемане работата на Изпълнителя, Изпълнителният директор на АДО „Дунав“ одобрява съответния Протокол.

Предоставянето на вътрешен документ на Възложителя или на трети лица се осъществява след съгласуване с Ръководителя на екипа.

Съдържанието на докладите, които предстои да бъдат изготвени ще бъде разработено от Консултанта, в срок от 10 дни, след подписване на договора, съгл. чл. 9.4. от публикувания проект на Договор, според който се изисква „Изпълнителят трябва да представи за одобрение съдържанието на доклада по всеки от резултатите.“

Таблица 5. Оценка на качеството върху документите

Предмет на преглед на качеството	Мярка на качеството	Оценка на качеството
Документ, изготвен от Консултанта	Мярка на качеството: дали всички изготвени документи са приети от Възложителя	Проверка дали има върнати за отстраняване на недостатъци и за корекции

В процеса на работа се предвижда генерирането на допълнителни документи и разработки, които се явяват надграждащ резултат на изискванията на Възложителя. В следваща таблица са отбелязани всички резултати, които участникът предвижда да постигне.

[Handwritten signature]



Таблица 6. Резултати от изпълнението на дейностите и под-дейностите, планирани от участника

Дейност/под-дейност	Планиран резултат
Дейност 1.	
Под-дейност 1.1	Пълно и качествено разбиране на целия обем предоставена информация и идентифициране на евентуални липси/несъответствия и неясноти
Под-дейност 1.2	Създадена пълна информационна база, необходима за разработване на промоционалните материали.
Под-дейност 1.3.	Селектирана полезна информация, необходима за разработване на промоционалните материали.
Под-дейност 1.4.	Общи графични насоки при изработването на художествено-графичните проекти (дизайни) на всички промоционални материали.
Под-дейност 1.5.	Избран вариант за обща визия на промоционалните материали
Под-дейност 1.6.	Създадена техническа спецификация и конструкция за мобилните приложения
Дейност 2.	
Под-дейност 2.1.	Разработени 2 концепции за приложение за смартфон/ друго преносимо устройство
Под-дейност 2.2.	Разработени 2 концепции за включена в приложението
Под-дейност 2.3.	Разработена концепция за уебсайт.
Под-дейност 2.4.	Изработена концепция за 120 минутен информационен филм за туристическия продукт, съдържащ отделни модули.
Под-дейност 2.5.	Изработена концепция за информационен каталог



Под-дейност 2.6.	Изработена концепция за брошура.
Под-дейност 2.7.	Одобрени Концепции за разработване на промоционални материали
Дейност 3.	
Под-дейност 3.1.	Разработена детайлна спецификация и конструкция на мобилното приложение
Под-дейност 3.2.	Разработена функционална спецификация на мобилното приложение, на база на посочените изисквания от Възложителя
Под-дейност 3.3.	Разработена функционална спецификация на мобилното приложение, на база на посочените изисквания от Възложителя
Под-дейност 3.4.	Изработен системен дизайн на мобилното приложение и приложенияте и инфраструктурно технологично решение.
Под-дейност 3.5.	Предложение за концепция за графична визуална концепция и графичен дизайн за мобилните приложения.
Под-дейност 3.6.	Изработено основно технологично ядро за работа на мобилните приложения, създаване на мобилните приложения готови за провеждане на тестове
Под-дейност 3.7.	Проведени функционално, потребителски, достъпни и тестове за сигурност на приложението
Под-дейност 3.8.	Изготвен анализ на резултатите от проведените тестове
Дейност 4.	
Под-дейност 4.1.	Разработен регламент на и правила за законосъобразност.
Под-дейност 4.2.	Разработена



Под-дейност 4.3.	Разработен план за популяризирането на
Дейност 5.	
Под-дейност 5.1.	Изработен детайлен план за работа, разделен по функционални звена и експерти
Под-дейност 5.2.	Разработена детайлна спецификация и конструкция на уебсайта
Под-дейност 5.3.	Разработена функционална спецификация на уебсайта, на база на посочените изисквания от Възложителя
Под-дейност 5.4.	Изработен системен дизайн на уебсайта и инфраструктурно технологично решение.
Под-дейност 5.5.	Предложение за концепция за графична визуална концепция и графичен дизайн за уебсайта.
Под-дейност 5.6.	Изработено основно технологично ядро за работа на уебсайта, създаване на уебсайта готов за провеждане на тестове
Под-дейност 5.7.	Проведени функционално, потребителски, достъпни и тестове за сигурност на уебсайта.
Под-дейност 5.8.	Изготвен анализ на резултатите от проведените тестове
Дейност 6.	
Под-дейност 6.1.	Синтезиран документ, включващ разпределението на дейностите в екипа и обща базова информация за проекта.
Под-дейност 6.2.	Разработен и финално одобрен от Възложителя сценарий за заснемане на информационен филм.
Под-дейност 6.3.	Разработен творческо-технически сценарий



Под-дейност 6.4.	Изготвен график за снимачния период
Под-дейност 6.5.	Общ сториборд и разкадровка
Под-дейност 6.6.	Заснет висококачествен филмов материал
Под-дейност 6.7.	Сценарий за монтаж и одобрен финален текст за дикторски глас в три езикови варианта - английски, български и румънски.
Под-дейност 6.8.	Одобрени от Възложителя саундтрак и дикторски гласове за различните езикови версии на информационния филм
Под-дейност 6.9.	Одобрени от Възложителя мащър копия на три езикови версии на информационния филм - българска, английска и румънска.
Дейност 7.	
Под-дейност 7.1.	Подготвено текстово съдържание и професионално обработен и подбран илюстративен материал за информационен каталог.
Под-дейност 7.2.	Цялостен художествено-графичен проект за информационен каталог
Под-дейност 7.3.	Одобрен от Възложителя художествено-графичен проект на информационния каталог на български език.
Под-дейност 7.4.	Финален коригиран вариант на информационния каталог.
Под-дейност 7.5.	Финален електронен PDF вариант на информационния каталог на български език, готов за използване в уеб-сайта, разработван по дейност 5.
Под-дейност 7.6.	Преведени текстове на електронния вариант на информационния каталог на английски и румънски.
Под-дейност 7.7.	Изработени и одобрени електронни PDF варианти на информационния



	каталог на английски и румънски език, готови за използване в уеб-сайта, разработван по дейност 5.
Под-дейност 7.8.	Одобрен предпечатен файл на информационния каталог на български, английски и румънски език.
Под-дейност 7.9.	Одобрени и отпечатани макети на информационния каталог в различни езикови версии - версия на български, английски и румънски език.
Дейност 8.	
Под-дейност 8.1.	Подготвено текстово съдържание и професионално обработен и избран илюстративен материал.
Под-дейност 8.2.	Изработен цялостен художествено-графичен проект за информационен каталог
Под-дейност 8.3.	Одобрен от Възложителя художествено-графичен проект на брошурата на български език.
Под-дейност 8.4.	Финален коригиран вариант на брошурата на български език.
Под-дейност 8.5.	Финален одобрен електронен PDF вариант на брошурата на български език, готов за използване в уеб-сайта, разработван по дейност 5.
Под-дейност 8.6.	Преведени текстове на електронния вариант на брошурата на английски и румънски език.
Под-дейност 8.7.	Финално одобрени от Възложителя PDF варианти на информационния каталог на английски и румънски език, готови за използване в интернет страницата, разработвана по дейност 5.
Под-дейност 8.8.	Одобрени предпечатни файлове на брошурата на български, английски и румънски език.
Под-дейност 8.9.	Одобрени и отпечатани макети на



[REDACTED]		брошурата в различни езикови версии - версии на български, английски и румънски език.
Дейност 9.		[REDACTED]
Под-дейност 9.1.	[REDACTED]	Протокол със становището на Възложителя за разработените мобилни приложения
Под-дейност 9.2.	[REDACTED]	Усъвършенстван продукт, отговарящ на очакванията на Възложителя.
Под-дейност 9.3.	[REDACTED]	Усъвършенстван краен резултат - [REDACTED]
Под-дейност 9.4.	[REDACTED]	Усъвършенстван краен резултат - уебсайт
Под-дейност 9.5.	[REDACTED]	Протокол за одобрение за тиражиране на цялото предвидено от Възложителя количество на информационния филм.
Под-дейност 9.6.	[REDACTED]	Протокол за одобрение за производство на цялото предвидено от Възложителя количество (тираж) на информационен каталог.
Под-дейност 9.7.	[REDACTED]	Протокол за одобрение за производство на цялото предвидено от Възложителя количество (тираж) на брошура.
Дейност 10.		[REDACTED]
Под-дейност 10.1.	[REDACTED]	Внедрени мобилните приложения, предоставени документи и свързани с разработката кодове.
Под-дейност 10.2.	[REDACTED]	Валидация и цялостна оценка на изработените мобилни приложения
Под-дейност 10.3.	[REDACTED]	Разработено приложение за смартфон/ друго преносимо устройство, вкл. [REDACTED]
Под-дейност 10.4.	[REDACTED]	Уебсайт на проекта
Дейност 11.		[REDACTED]
Под-дейност 11.1.	[REDACTED]	Възлагателно писмо за тиражиране на информационния филм в заявления



	тираж
Под-дейност 11.2.	Записан върху DVD информационен филм в заявения тираж.
Под-дейност 11.3.	Брандирани и вложени в пластмасови кутии с пълноцветни вложки DVD дискове, фолирани по единично в заявения тираж.
Под-дейност 11.4.	Доставени и приети от страна на Възложителя брандирани и опаковани DVD дискове в заявения тираж.
Дейност 12.	
Под-дейност 12.1.	Възлагателно писмо за отпечатване на заявения тираж на информационните каталози съответно на български, английски и румънски език.
Под-дейност 12.2.	Отпечатани информационни каталози на български език: 5000 бр., Отпечатани информационни каталози на английски език: 2500 бр., Отпечатани информационни каталози на румънски език: 2500 бр.
Под-дейност 12.3.	Доставени и приети от страна на Възложителя информационни каталози при следните количества: Отпечатани информационни каталози на български език: 5000 бр., Отпечатани информационни каталози на английски език: 2500 бр., Отпечатани информационни каталози на румънски език: 2500 бр.
Под-дейност 12.4.	Възлагателно писмо за отпечатване на заявения тираж на брошурата съответно на български, английски и румънски език.
Под-дейност 12.5.	Отпечатани брошури на български език: 15 000 бр., Отпечатани брошури на английски език: 7500 бр., Отпечатани брошури на румънски език: 7500 бр.
Под-дейност 12.6.	Доставени и приети от страна на Възложителя брошури при следните количества: Отпечатани брошури на български език: 15 000 бр., Отпечатани брошури на английски език: 7500 бр., Отпечатани брошури на румънски



език: 7500 бр.	
Дейност 13.	
Под-дейност 13.1.	Встъпителен доклад за изпълнение на поръчката
Под-дейност 13.2.	Междинен доклад за мобилно приложение
Под-дейност 13.3.	Междинен доклад за уебсайт
Под-дейност 13.4.	Междинен доклад за филма
Под-дейност 13.5.	Междинен доклад за информационен каталог
Под-дейност 13.6.	Междинен доклад за брошура
Под-дейност 11.7.	Финален доклад за изпълнението на поръчката.

Мярка 6.

Участникът ще създаде необходимата организация за поддръждане, архивиране и съхраняване на документите, свързани с изпълнението на поръчката. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи. В процеса на изпълнение на поръчката ще се поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация относно извършването на възложената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

Участникът ще води техническо досие за своето изпълнение, в което да бъдат отделно обособени документите, свързани с процеса на изпълнение на всеки един от промоционалните продукти: мобилно приложение и информационен каталог. Всеки документ ще се регистрира по реда на създаване, на хартиен и електронен носител.

По време на изпълнението оригиналните документи се съхраняват от Техническият сътрудник от екипа на Изпълнителя и той отговаря за предаването им на представляващия консорциума за архивиране, след приключване на оперативната работа. Отговорните служители задължително предоставят информация и осигуряват достъп на одитиращи и контролни органи до архива, при извършването на проверки на място и одити.

След приключване на договора, съгл. чл.7.18, изпълнителят ще съхранява идентично техническо досие на изпълнението, в което ще бъде обхваната цялата документация, описана по-горе за:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., т.е. поне до 31 август 2027 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНИТЕ РАБОТИ



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



- за период от 3 години след частичното приключване на проектите по настоящата поръчка.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). Наред с техническото предложение, ако е приложимо се представя и декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП.

Дата 03/ 06/ 2016 г.
Име и фамилия Любомир Тушанов
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност Представяващ
Наименование на участника ОБЕДИНЕНИЕ „АДО
КОМЮНИКЕЙШЪН”



ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП²⁷
Подписаният Любомир Василев Тушанов
(*трите имена*)

данни по документ за самоличност лична карта №644906877, издадена на 11.11.2013 г.
от МВР - София

(*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*)
в качеството си на представляващ

(*длъжност*)

на ОБЕДИНЕНИЕ „АДО КОМЮНИКЕЙШЪН“,


(*наименование на участника*)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в техническото ни предложение (ПЛИК 2), да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата	06/06/2016
Име и фамилия	Любомир Василев Тушанов
Подпис (и печат)	  

ММД
15.2.1.067
Годисна цена
